

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三
1	启动	启动	7 个工作日	2018年9月13日	2018年9月21日												
2	组建核心团队	组建核心团队	1 个工作日	2018年9月13日	2018年9月13日		项目经理, UI专家										
3	干系人分析	干系人分析	2 个工作日	2018年9月14日	2018年9月16日		项目经理										
4	里程碑计划	里程碑计划	1 个工作日	2018年9月17日	2018年9月17日		项目经理										
5	指定项目章程	指定项目章程	2 个工作日	2018年9月18日	2018年9月19日	2, 3, 4	项目经理										
6	项目启动大会	项目启动大会	2 个工作日	2018年9月20日	2018年9月21日	5	项目经理, 需求专家										
7	规划	规划	28 个工作日	2018年9月19日	2018年10月26日												
8	规划范围	规划范围	11 个工作日	2018年9月19日	2018年10月3日												
9	制定需求说明书	制定需求说明书	1 个工作日	2018年9月24日	2018年9月24日	6	需求专家										
10	界面设计	界面设计	5 个工作日	2018年9月25日	2018年10月1日	9	UI专家										
11	详细设计说明书	详细设计说明书	2 个工作日	2018年9月25日	2018年9月26日	9	设计专家										
12	范围说明书	范围说明书	2 个工作日	2018年9月25日	2018年9月26日	9	项目经理										
13	创建WBS	创建WBS	1 个工作日	2018年10月2日	2018年10月2日	11, 10, 12	项目经理										
14	形成范围基准	形成范围基准	1 个工作日	2018年10月3日	2018年10月3日	13	项目经理										
15	规划时间	规划时间	7 个工作日	2018年10月2日	2018年10月10日												
16	排列工作包顺序	排列工作包顺序	1 个工作日	2018年10月4日	2018年10月4日	14	项目经理										
17	估算资源	估算资源	1 个工作日	2018年10月5日	2018年10月5日	16	项目经理										
18	估算持续时间	估算持续时间	1 个工作日	2018年10月6日	2018年10月6日												
19	制定进度计划	制定进度计划	2 个工作日	2018年10月7日	2018年10月8日												
20	形成进度基准	形成进度基准	1 个工作日	2018年10月2日	2018年10月2日												
21	规划成本	规划成本	2 个工作日	2018年10月4日	2018年10月5日												
22	项目成本估计	项目成本估计	1 个工作日	2018年10月4日	2018年10月4日												
23	项目预算	项目预算	1 个工作日	2018年10月5日	2018年10月5日												
24	规划质量	规划质量	2 个工作日	2018年10月6日	2018年10月8日												
25	制定测试计划	制定测试计划	1 个工作日	2018年9月28日	2018年9月28日	16	测试专家										
26	指定测试用例	指定测试用例	2 个工作日	2018年10月6日	2018年10月8日												
27	规划人力资源	规划人力资源	3 个工作日	2018年10月7日	2018年10月9日												
28	制定人力资源计划	制定人力资源计划	1 个工作日	2018年10月7日	2018年10月7日												
29	制定人员配备管理计划	制定人员配备管理计划	2 个工作日	2018年10月8日	2018年10月9日	28	项目经理										
30	规划沟通	规划沟通	1 个工作日	2018年10月10日	2018年10月10日												
31	制定沟通管理计划	制定沟通管理计划	1 个工作日	2018年10月10日	2018年10月10日												

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

◇

◇

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月	10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三
32	🚀	规划采购	3 个工作日	2018年10月12日	2018年10月16日													
33	🚀	制定采购分析	1 个工作日	2018年10月11日	2018年10月11日													
34	🚀	制定采购文件	3 个工作日	2018年10月12日	2018年10月16日	33	运营主管											
35	🚀	规划风险	8 个工作日	2018年10月17日	2018年10月26日													
36	🚀	识别风险	2 个工作日	2018年10月17日	2018年10月18日													
37	🚀	风险分析	3 个工作日	2018年10月19日	2018年10月23日	36	测试专家											
38	🚀	制定风险登记册	1 个工作日	2018年10月24日	2018年10月24日	37	测试专家											
39	🚀	规划整合	2 个工作日	2018年10月25日	2018年10月26日													
40	🚀	执行与监控	24 个工作日	2018年10月27日	2018年11月28日													
41	🚀	组建项目团队	1 个工作日	2018年10月27日	2018年10月27日													
42	🚀	项目执行	13 个工作日	2018年10月28日	2018年11月13日													
43	🚀	公共模块	3 个工作日	2018年10月28日	2018年10月30日													
44	🚀	广告	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41	程序员1											
45	🚀	每日促销活动	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44	程序员1											
46	🚀	星级大厨推荐	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44	程序员1											
47	🚀	“大厨”模块	6 个工作日	2018年10月30日	2018年11月6日													
48	🚀	厨师审核	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41	程序员2											
49	🚀	厨师分类	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	48	程序员2											
50	🚀	厨师级别	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	48	程序员2											
51	🚀	订单处理	3 个工作日	2018年10月31日	2018年11月2日	50	程序员2											
52	🚀	查看历史订单	2 个工作日	2018年11月5日	2018年11月6日	51	程序员2											
53	🚀	“消费者”模块	3 个工作日	2018年11月7日	2018年11月9日													
54	🚀	口味分析及推荐	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41	程序员3											
55	🚀	订单处理	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	54	程序员3											
56	🚀	查看历史订单	1 个工作日	2018年10月31日	2018年10月31日	55	程序员3											
57	🚀	管理员模块	3 个工作日	2018年11月10日	2018年11月13日													
58	🚀	厨师审核	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41	程序员4											
59	🚀	分析数据	1 个工作日	2018年11月12日	2018年11月12日	52, 56	程序员4											
60	🚀	广告管理	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44	程序员4											
61	🚀	新鲜蔬菜管理	1 个工作日	2018年11月13日	2018年11月13日		程序员4											
62	🚀	项目监控	5 个工作日	2018年11月14日	2018年11月20日													

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

.....

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◆

↓

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三
63		各项指标监控	1 个工作日	2018年11月14日	2018年11月14日												
64		监控评审	2 个工作日	2018年11月15日	2018年11月16日	63	项目经理助理										
65		变更评审	1 个工作日	2018年11月19日	2018年11月19日	64	项目经理										
66		例会	1 个工作日	2018年11月20日	2018年11月20日												
67		管理干系人	3 个工作日	2018年11月21日	2018年11月23日												
68		发布项目信息	1 个工作日	2018年11月21日	2018年11月21日												
69		报告监控指标	1 个工作日	2018年11月22日	2018年11月22日												
70		干系人沟通	1 个工作日	2018年11月23日	2018年11月23日	69	UI专家, 项目经理										
71		团队建设	2 个工作日	2018年11月24日	2018年11月26日												
72		培训	1 个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日												
73		娱乐活动	1 个工作日	2018年11月25日	2018年11月25日												
74		沟通	1 个工作日	2018年11月26日	2018年11月26日												
75		采购	1 个工作日	2018年11月27日	2018年11月27日												
76		项目验收	1 个工作日	2018年11月28日	2018年11月28日												
77		收尾	2 个工作日	2018年11月28日	2018年11月29日												
78		项目终验	1 个工作日	2018年11月29日	2018年11月29日	76	产品经理, 项目经理										
79		结束采购	2 个工作日	2018年11月28日	2018年11月29日	75	需求专家										
80		项目内部收尾	1 个工作日	2018年11月29日	2018年11月29日	76	产品经理										

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务










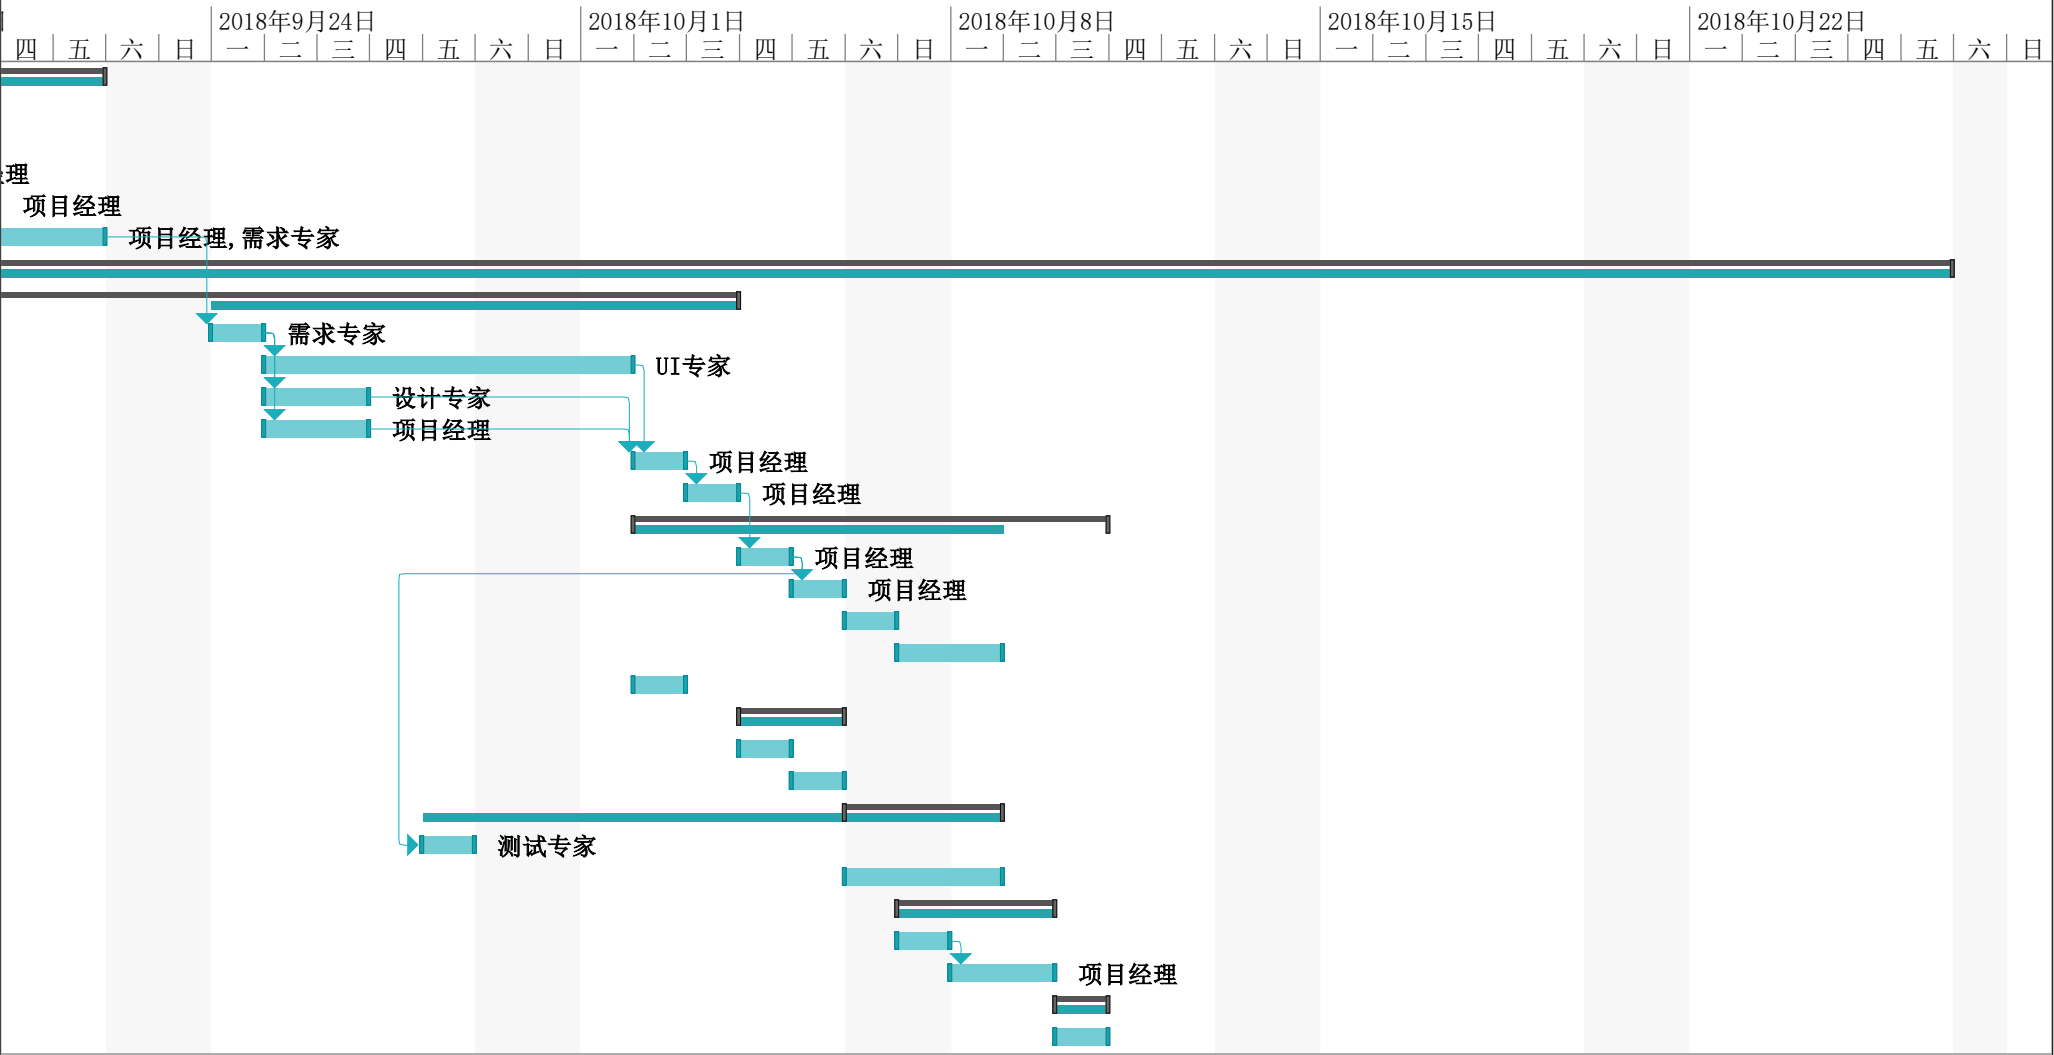









外部里程碑


最后期限

进度

手动进度





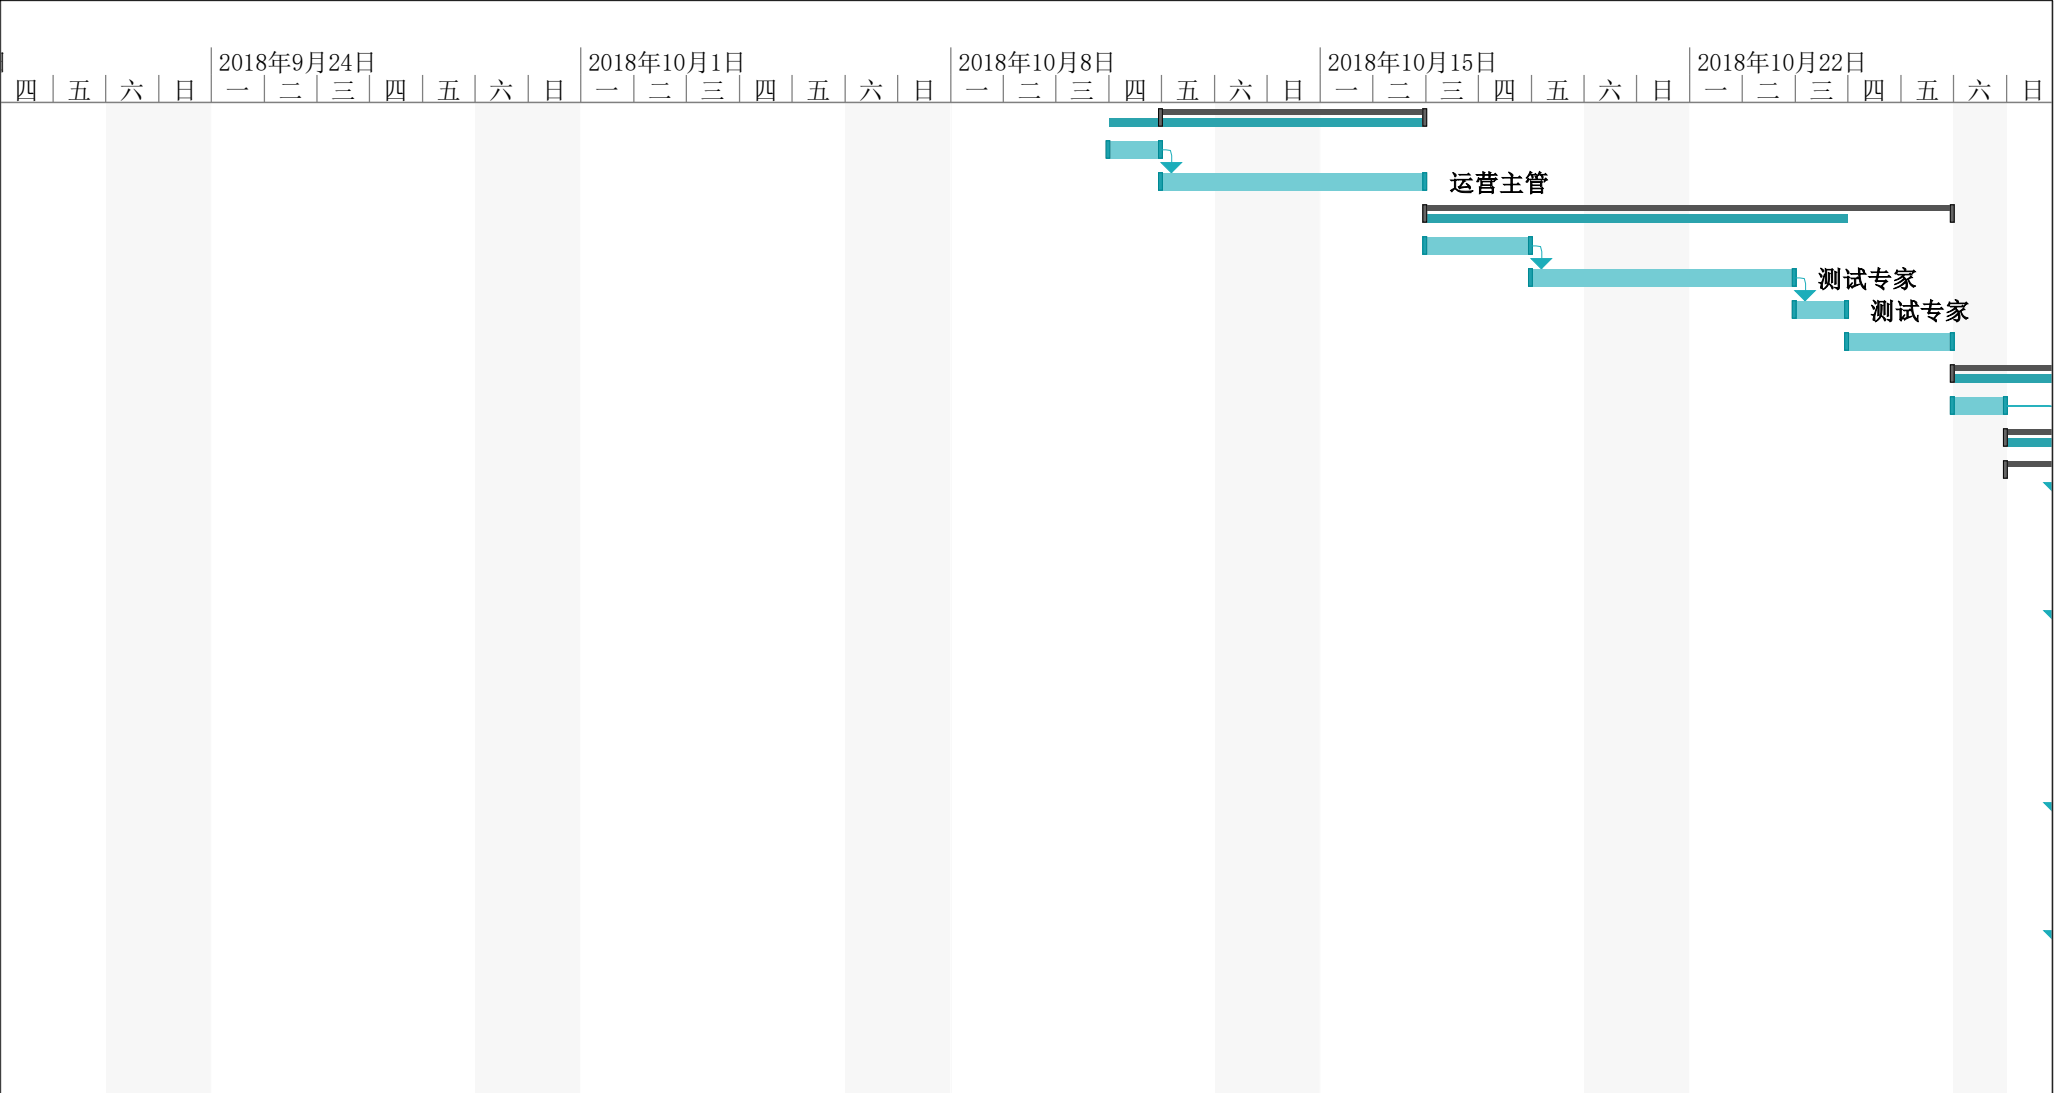
















项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			




项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			




[illegible]

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

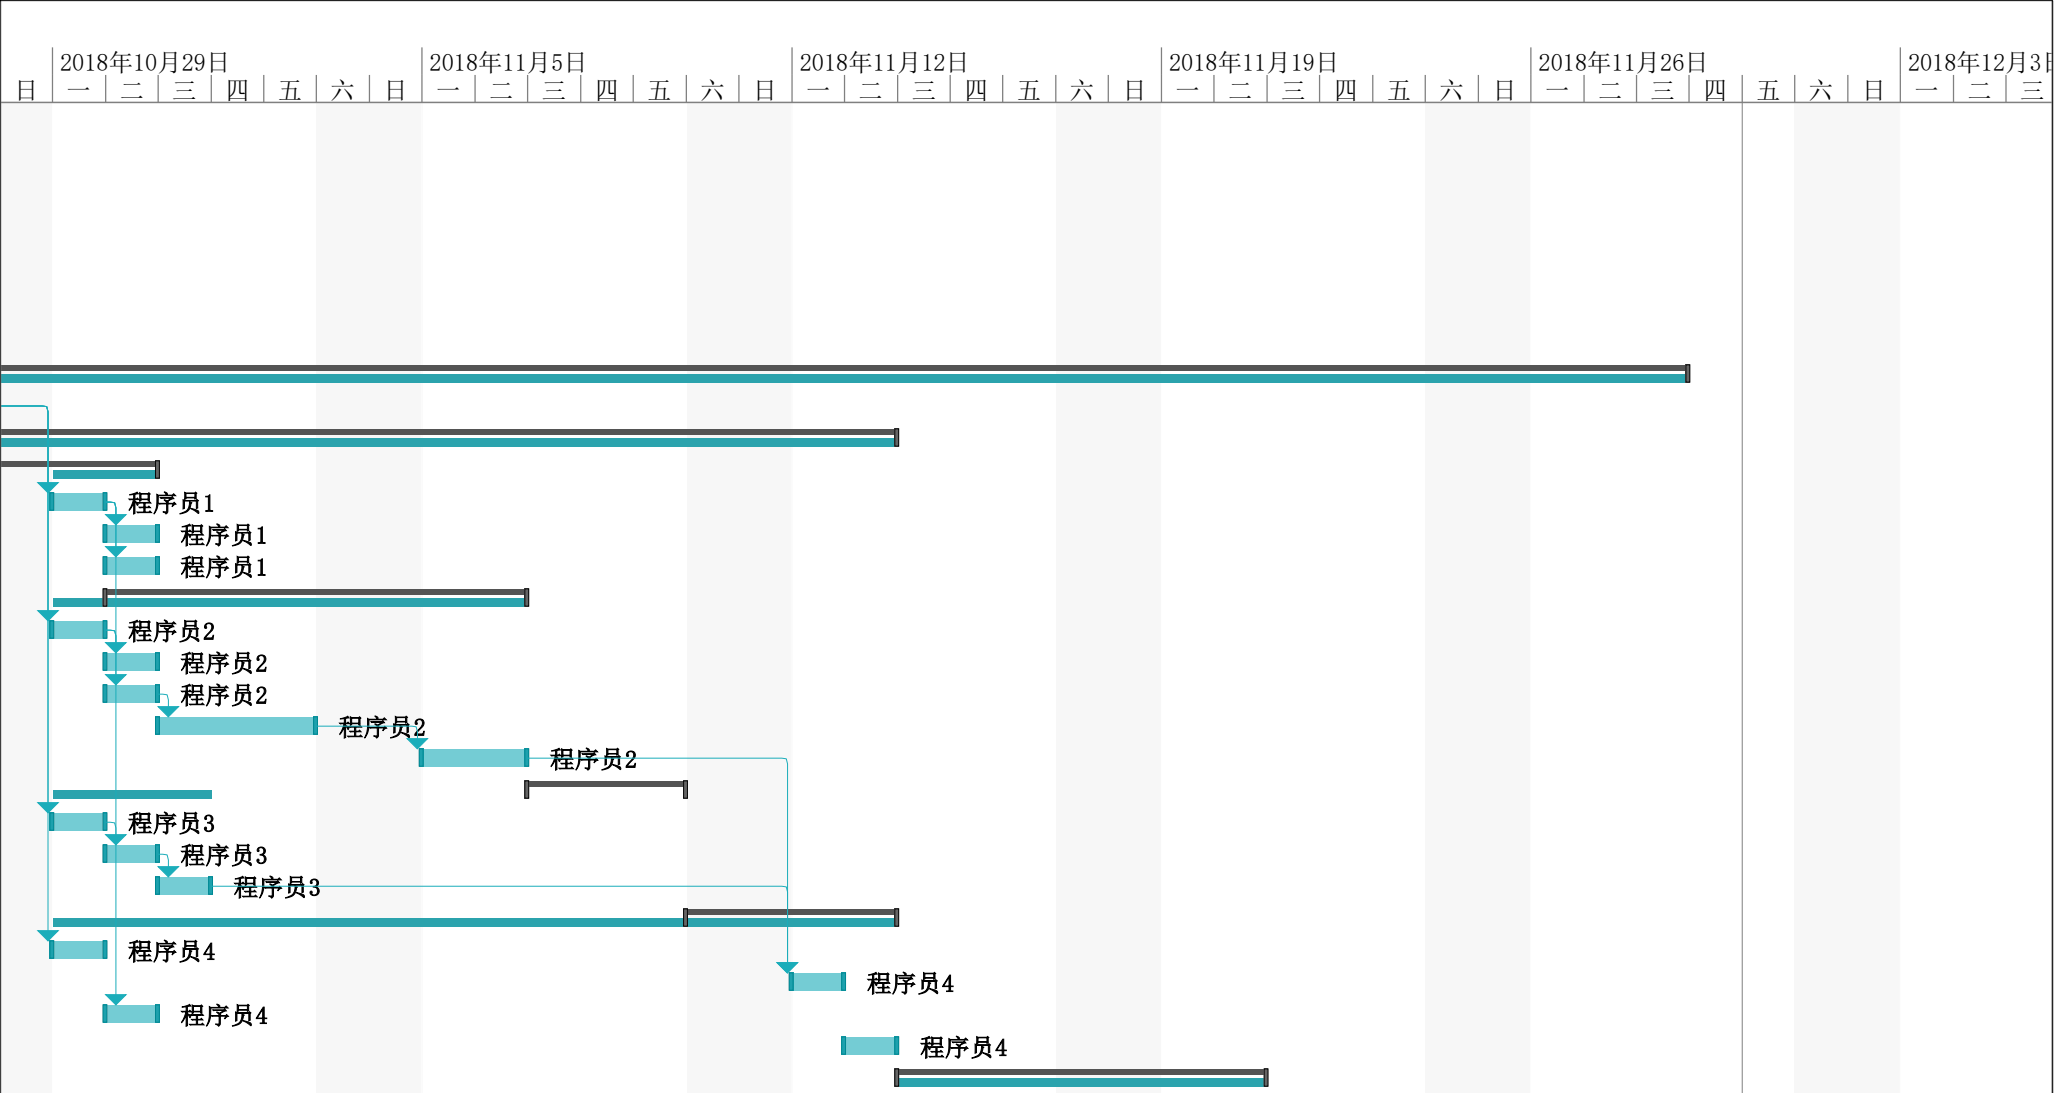

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



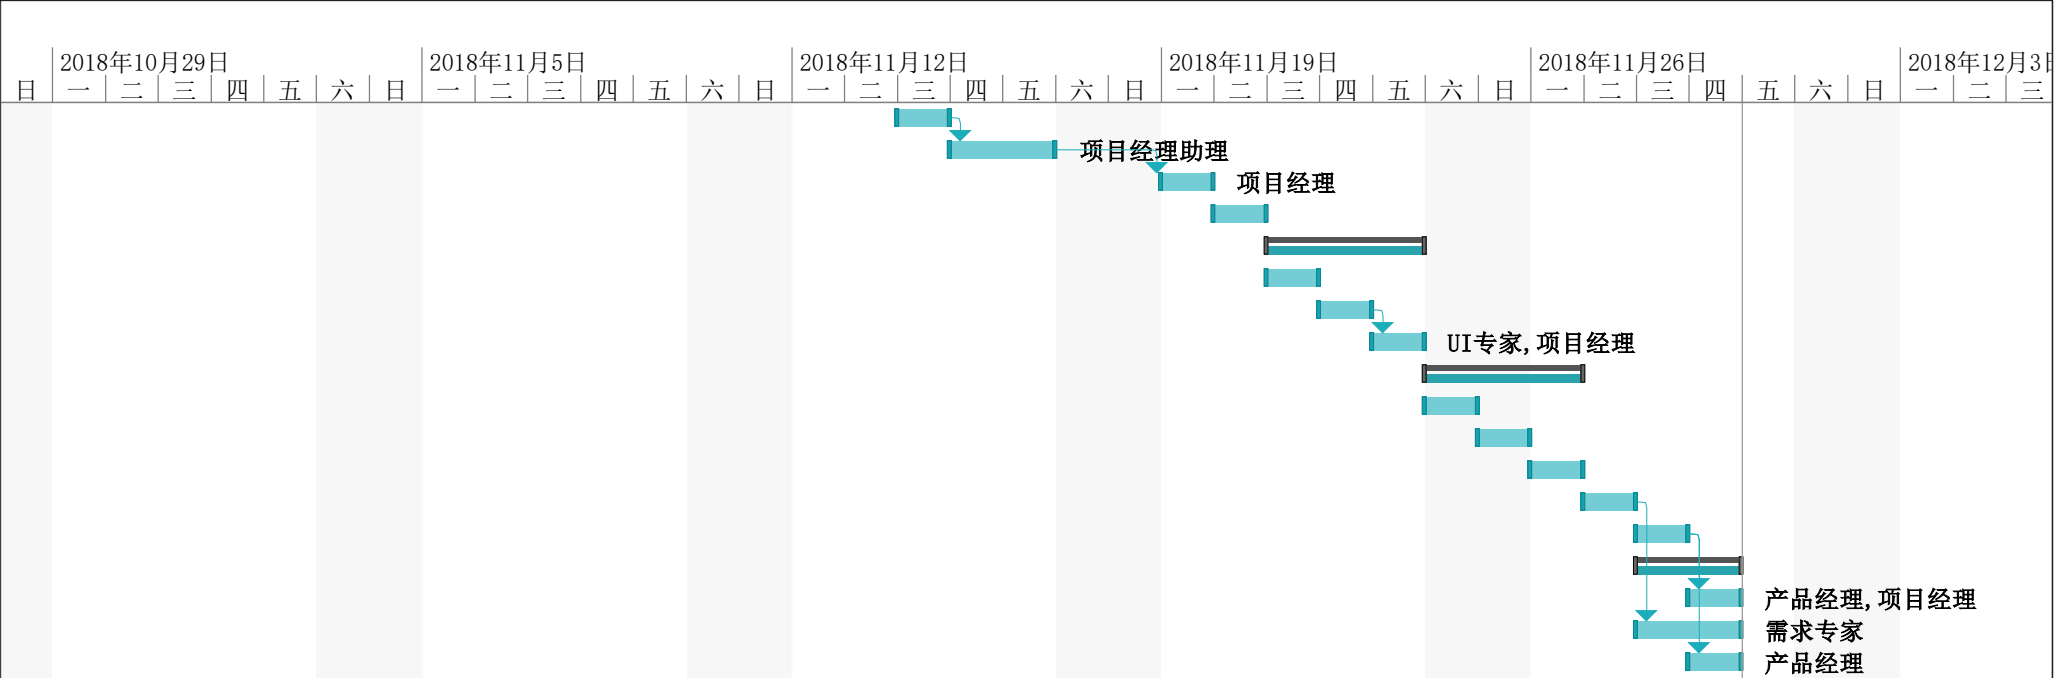

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			
