

项目：项目1
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期					2019年3月11日							2019年3月18日							2019年3月25日				
				四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
35		自制外购分析	2 个工作日?																							
36		制定采购文件	5 个工作日?																							
37		规划风险	3 个工作日																							
38		识别风险	1 个工作日?																							
39		风险分析	1 个工作日?																							
40		制定风险登记册	1 个工作日?																							
41		规划整合	1 个工作日?																							
42		执行与监控	16 个工作日																							
43		组建项目团队	3 个工作日?																							
44		项目执行	13 个工作日																							
45		用户模块	13 个工作日																							
46		首页	3 个工作日?																							
47		注册登录	3 个工作日?																							
48		下单	2 个工作日?																							
49		个人配置	2 个工作日?																							
50		选择“厨师”	3 个工作日?																							
51		“厨师”模块	10 个工作日																							
52		首页	3 个工作日?																							
53		接单	2 个工作日?																							
54		订单处理	3 个工作日?																							
55		个人配置	2 个工作日?																							
56		管理员模块	9 个工作日																							
57		“厨师”审核	4 个工作日?																							
58		统计分析	3 个工作日?																							
59		备份	2 个工作日?																							
60		项目监控	3 个工作日																							
61		各项指标监控	1 个工作日?																							
62		监控评审	1 个工作日?																							
63		变更评审	1 个工作日?																							
64		例会	1 个工作日?																							
65		管理干系人	1 个工作日																							
66		发布项目信息	1 个工作日?																							
67		报告监控指标	1 个工作日?																							
68		干系人沟通	1 个工作日?																							

项目：项目1
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	四 五 六 日				2019年3月11日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月18日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月25日 一 二 三 四 五				
69			团队建设	1 个工作日																							
70			培训	1 个工作日?																							
71			娱乐活动	1 个工作日?																							
72			沟通	1 个工作日?																							
73			采购	20 个工作日																							
74			项目验收	1 个工作日?																							
75			收尾	1 个工作日																							
76			项目终验	1 个工作日?																							
77			结束采购	1 个工作日?																							
78			项目内部收尾	1 个工作日?																							
79																											
80																											
81																											
82																											
83																											
84																											
85																											
86																											
87																											
88																											
89																											
90																											
91																											
92																											
93																											
94																											
95																											
96																											
97																											
98																											
99																											
100																											
101																											
102																											

项目：项目1
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间




































外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期					2019年3月11日							2019年3月18日							2019年3月25日				
					四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五
103																											
104																											
105																											
106																											
107																											
108																											
109																											
110																											
111																											
112																											
113																											
114																											
115																											
116																											
117																											
118																											
119																											
120																											
121																											
122																											
123																											
124																											
125																											
126																											
127																											
128																											
129																											
130																											
131																											
132																											
133																											
134																											
135																											
136																											

项目：项目1
日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间



























外部任务

外部里程碑



















最后期限


进度


手动进度


标识号		任务模式	任务名称	工期	四 五 六 日				2019年3月11日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月18日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月25日 一 二 三 四 五				
137																											
138																											
139																											
140																											
141																											
142																											
143																											
144																											
145																											
146																											
147																											
148																											
149																											
150																											
151																											
152																											
153																											
154																											
155																											
156																											
157																											
158																											
159																											
160																											
161																											
162																											


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目：项目1 日期：2019年6月18日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

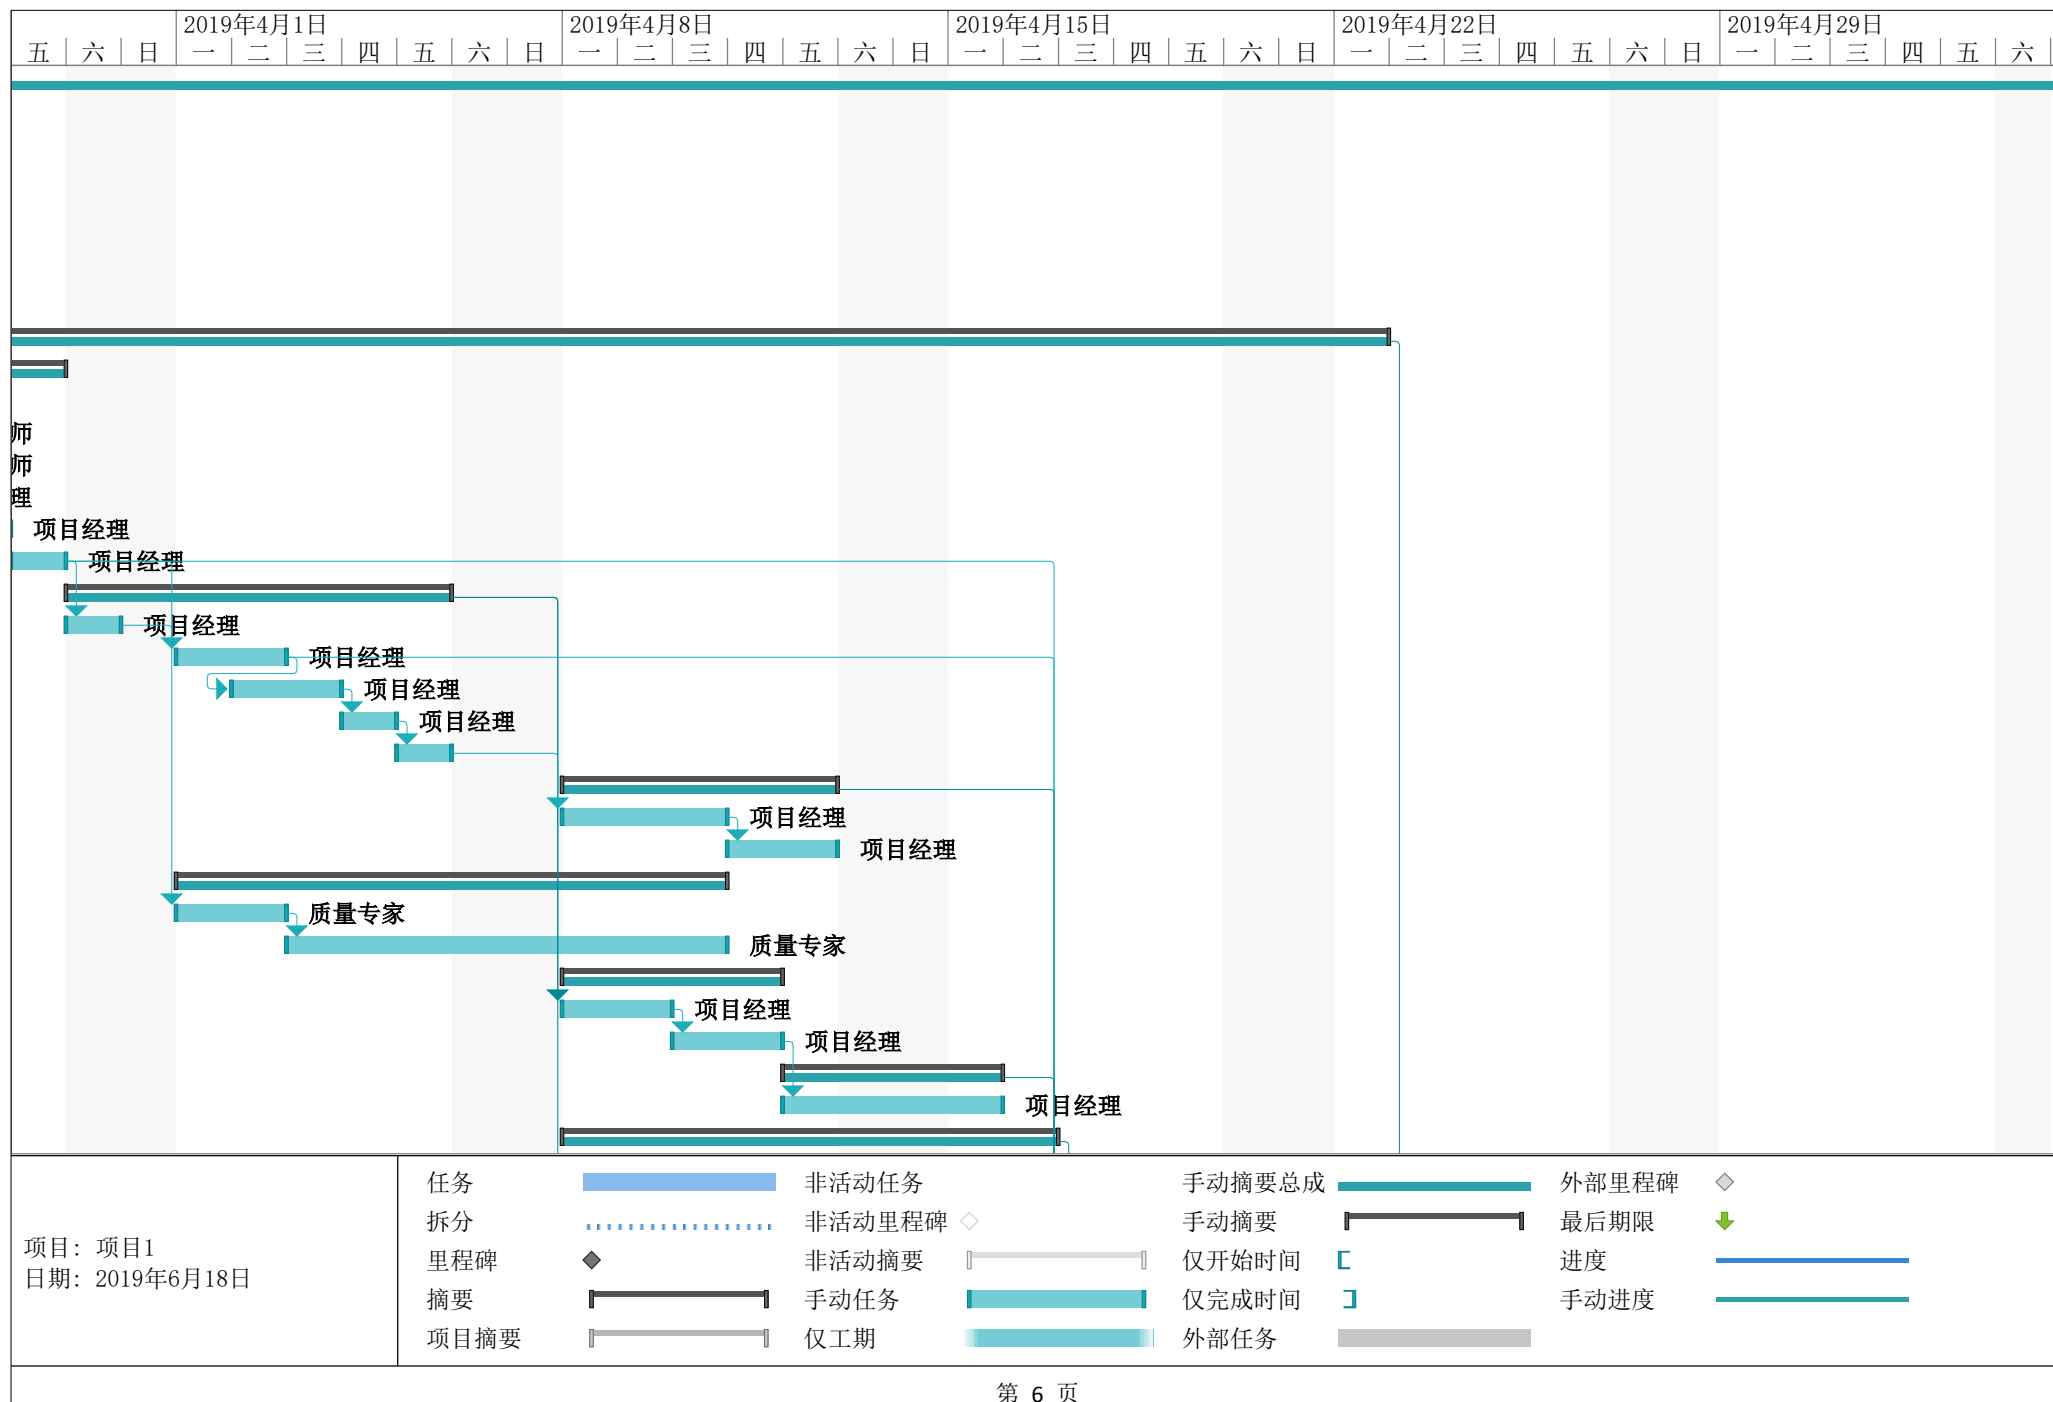

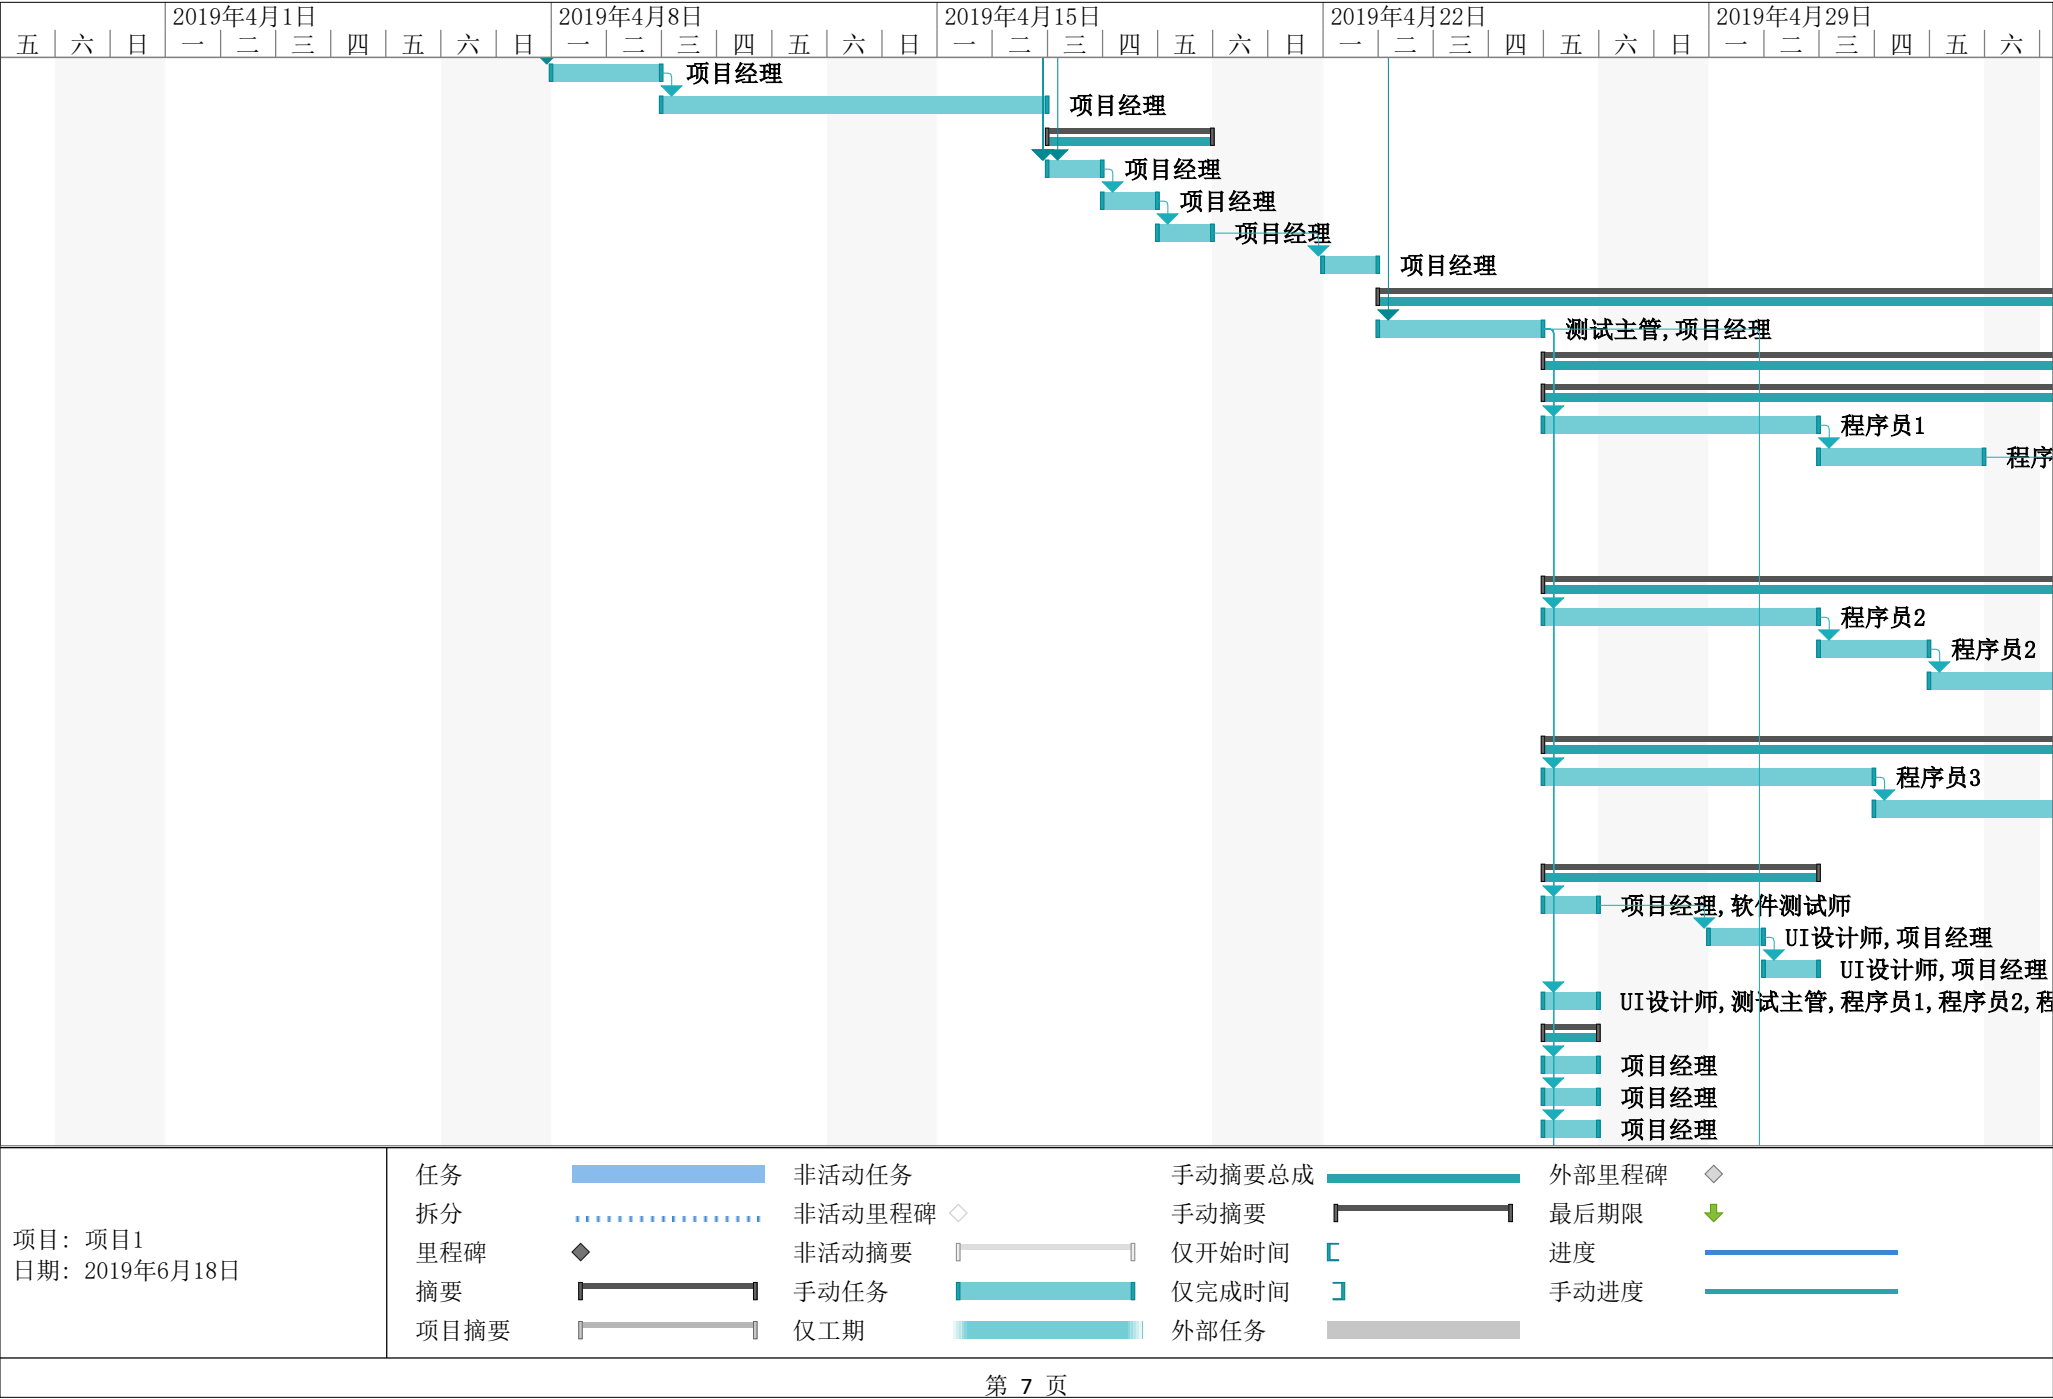


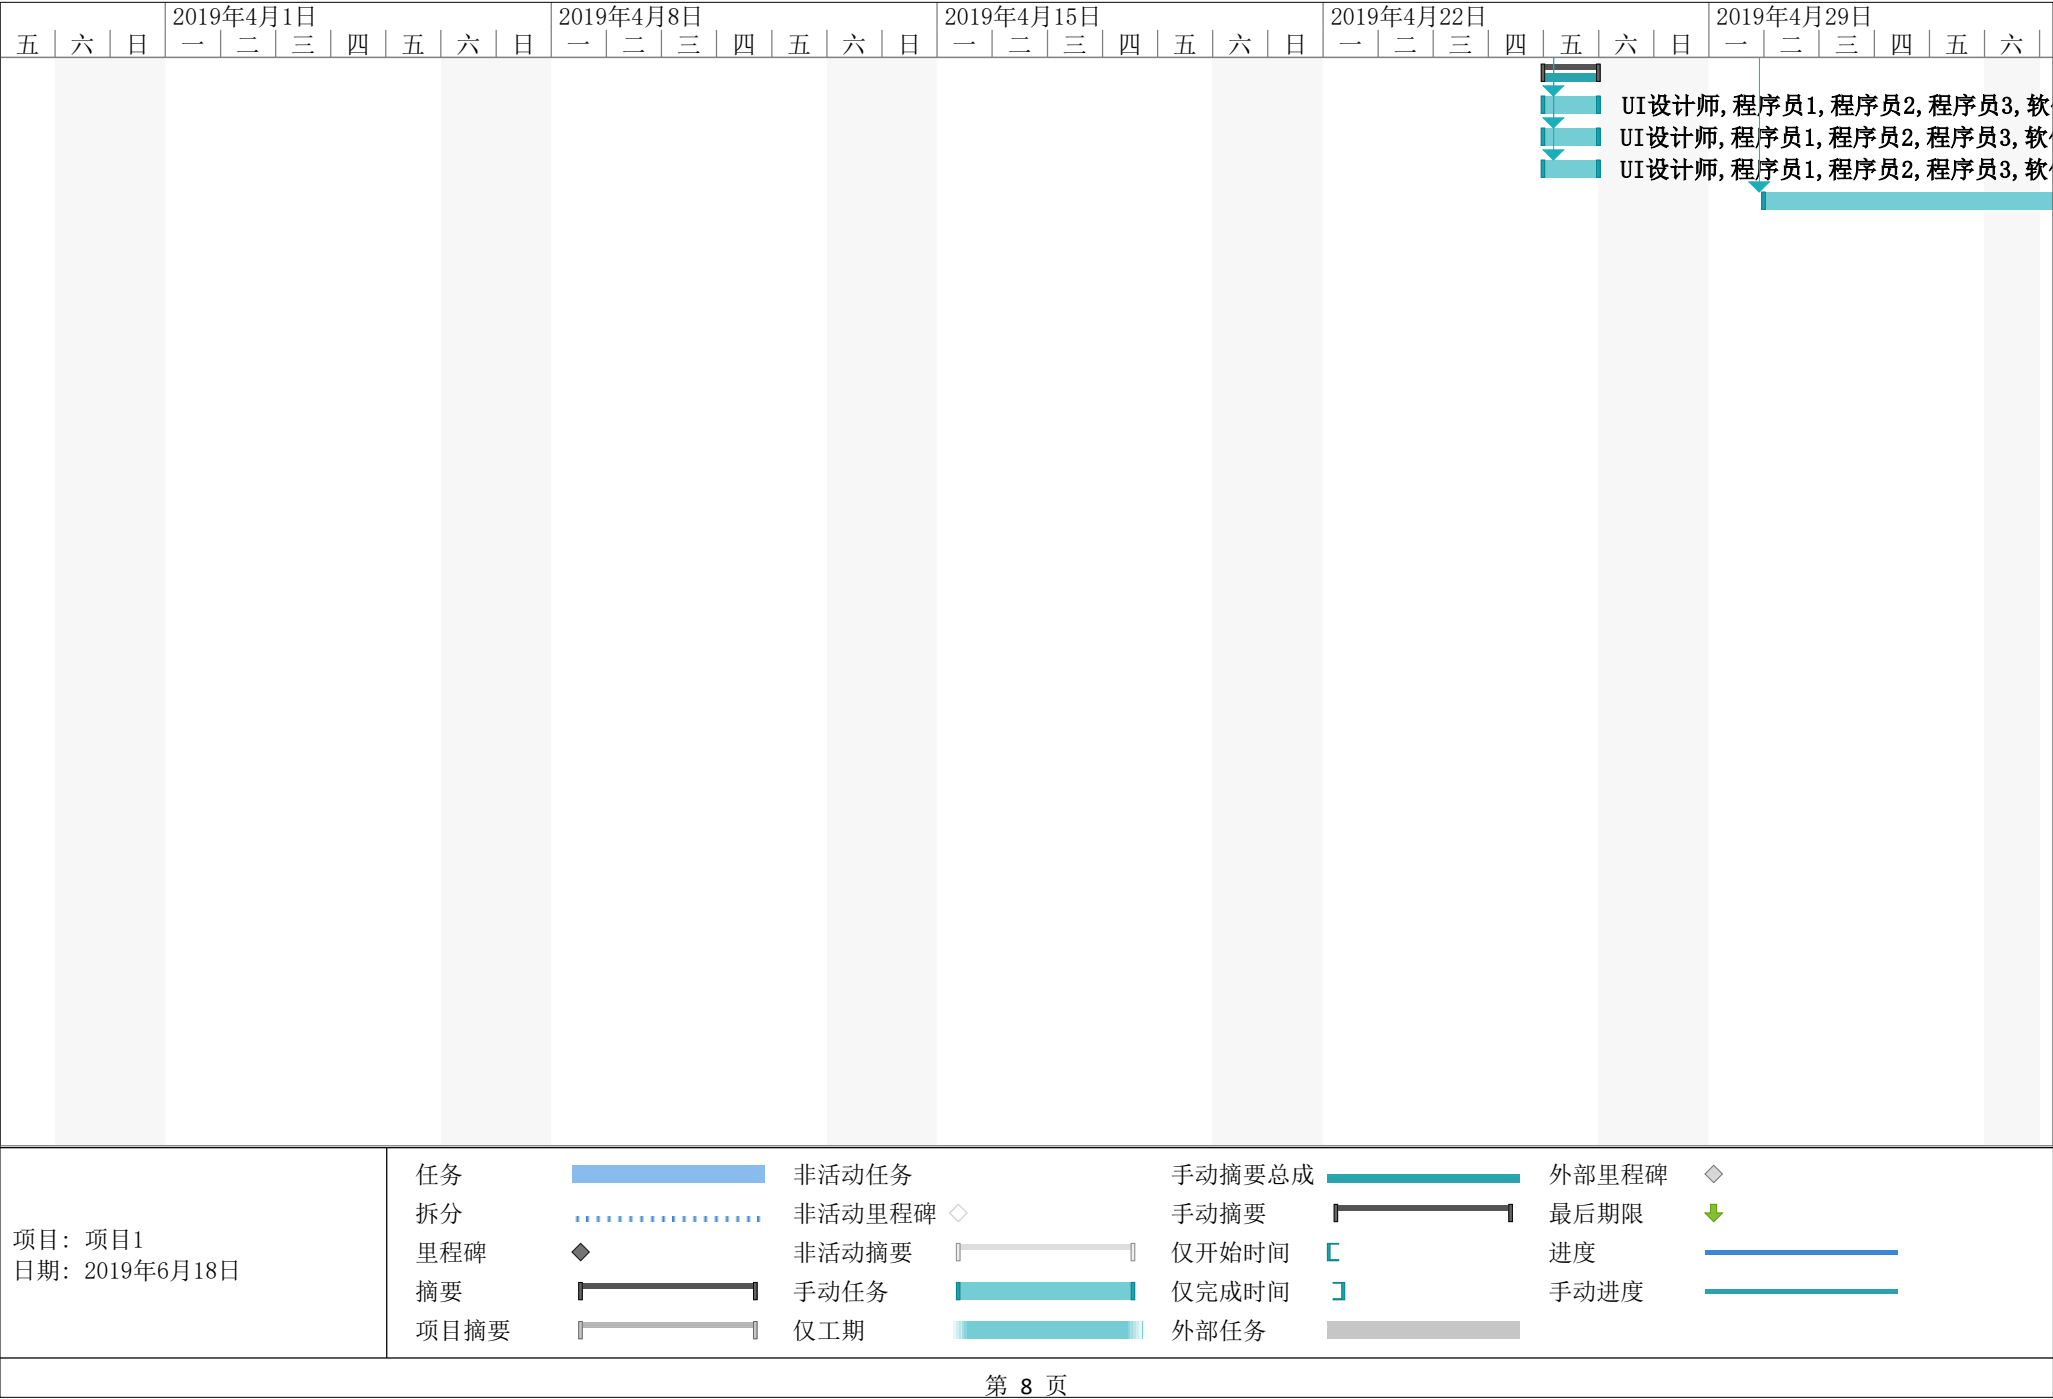


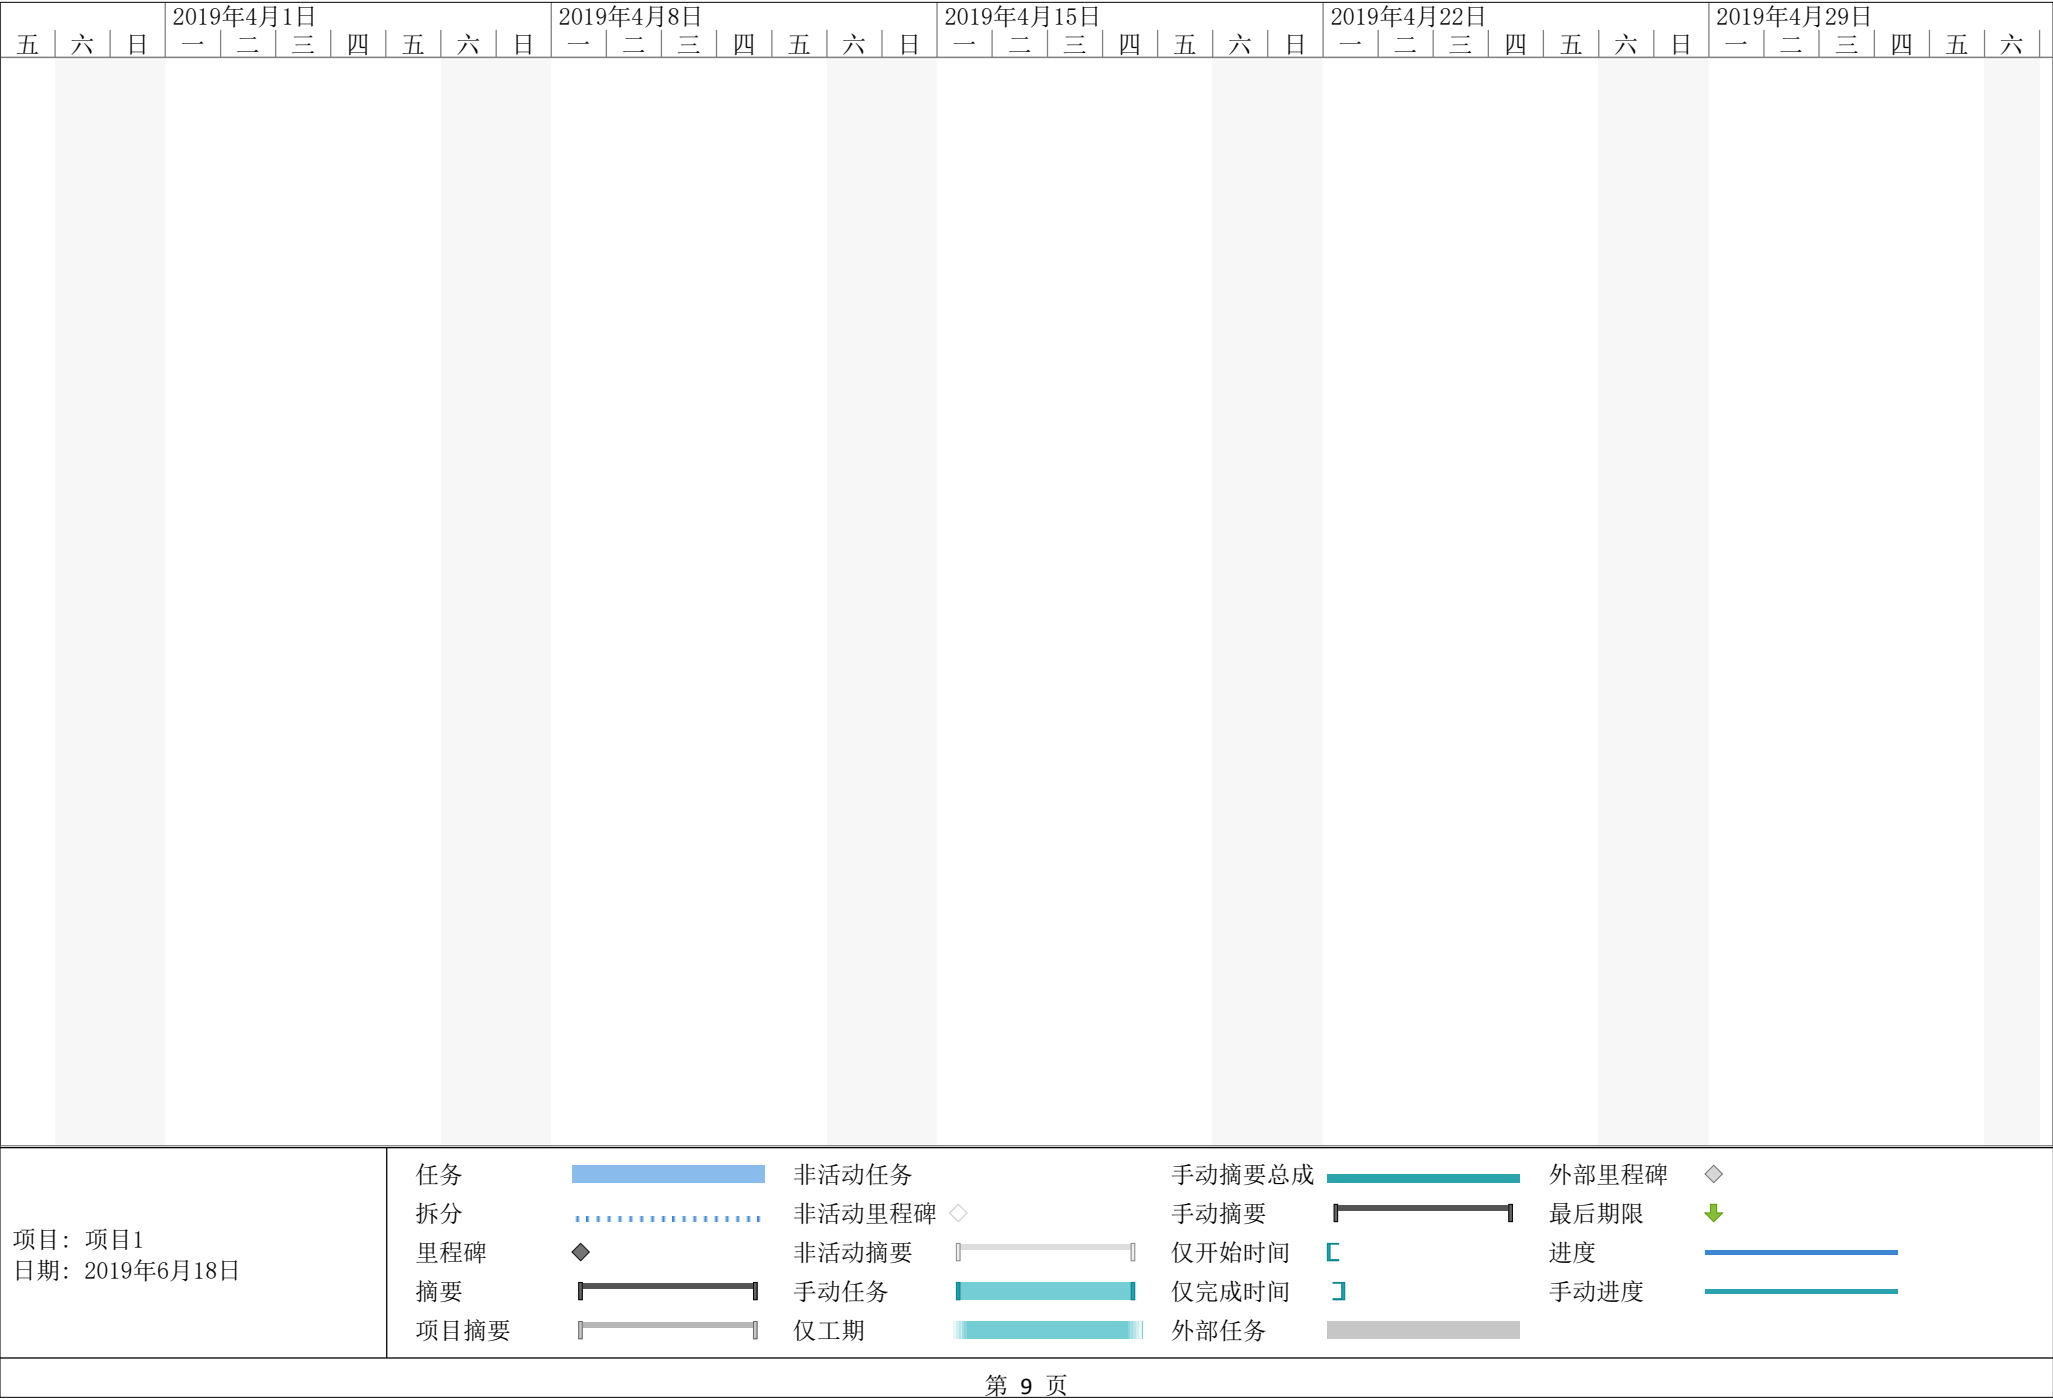



第 9 页

[illegible]

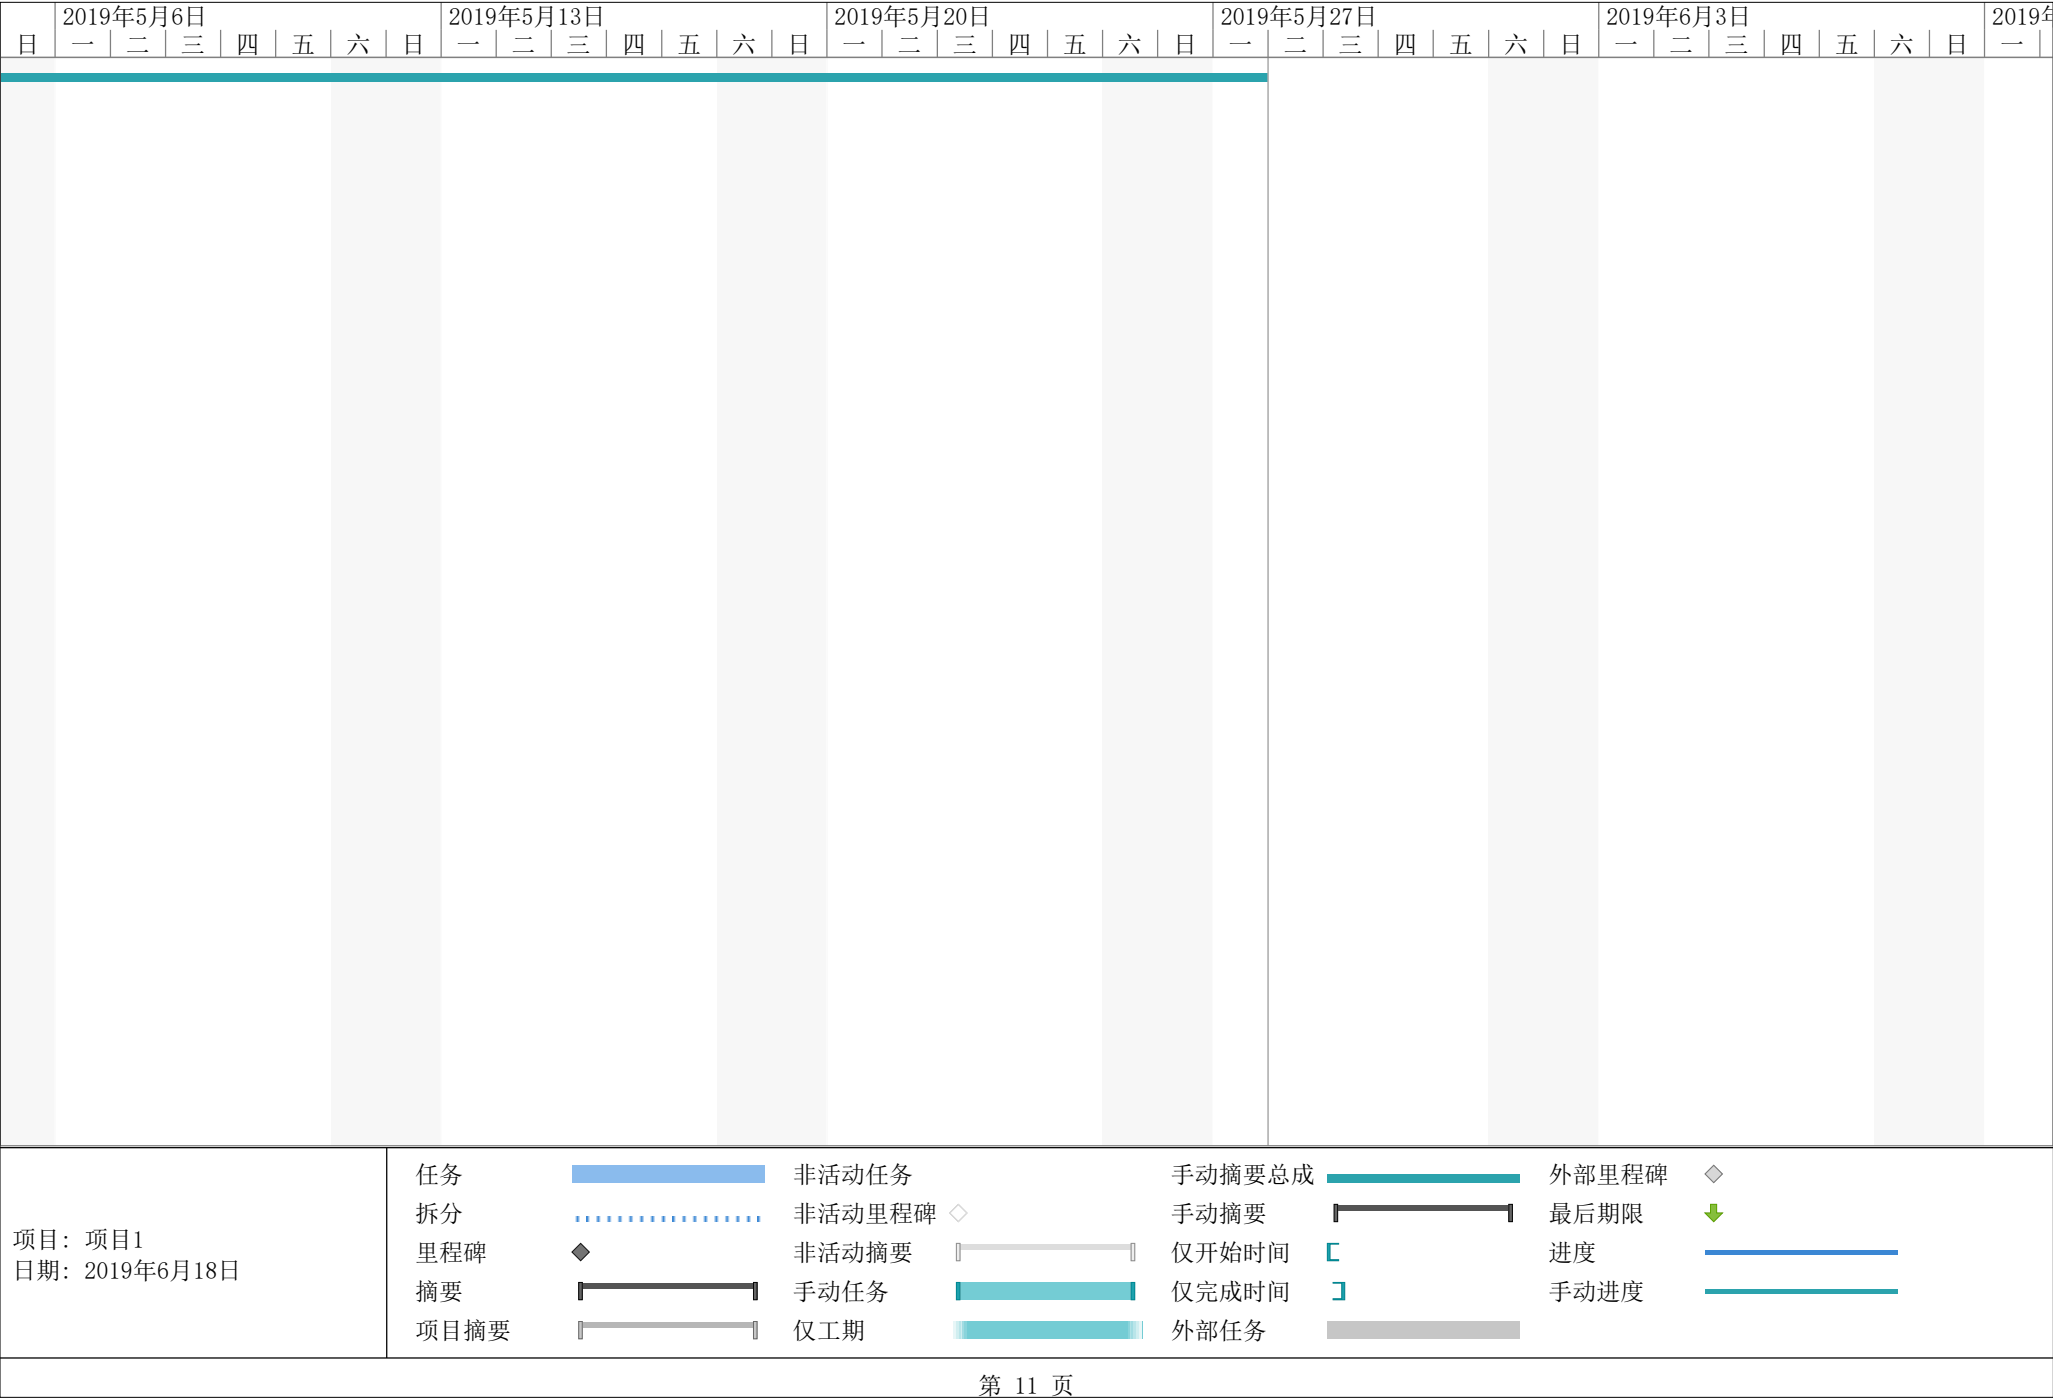

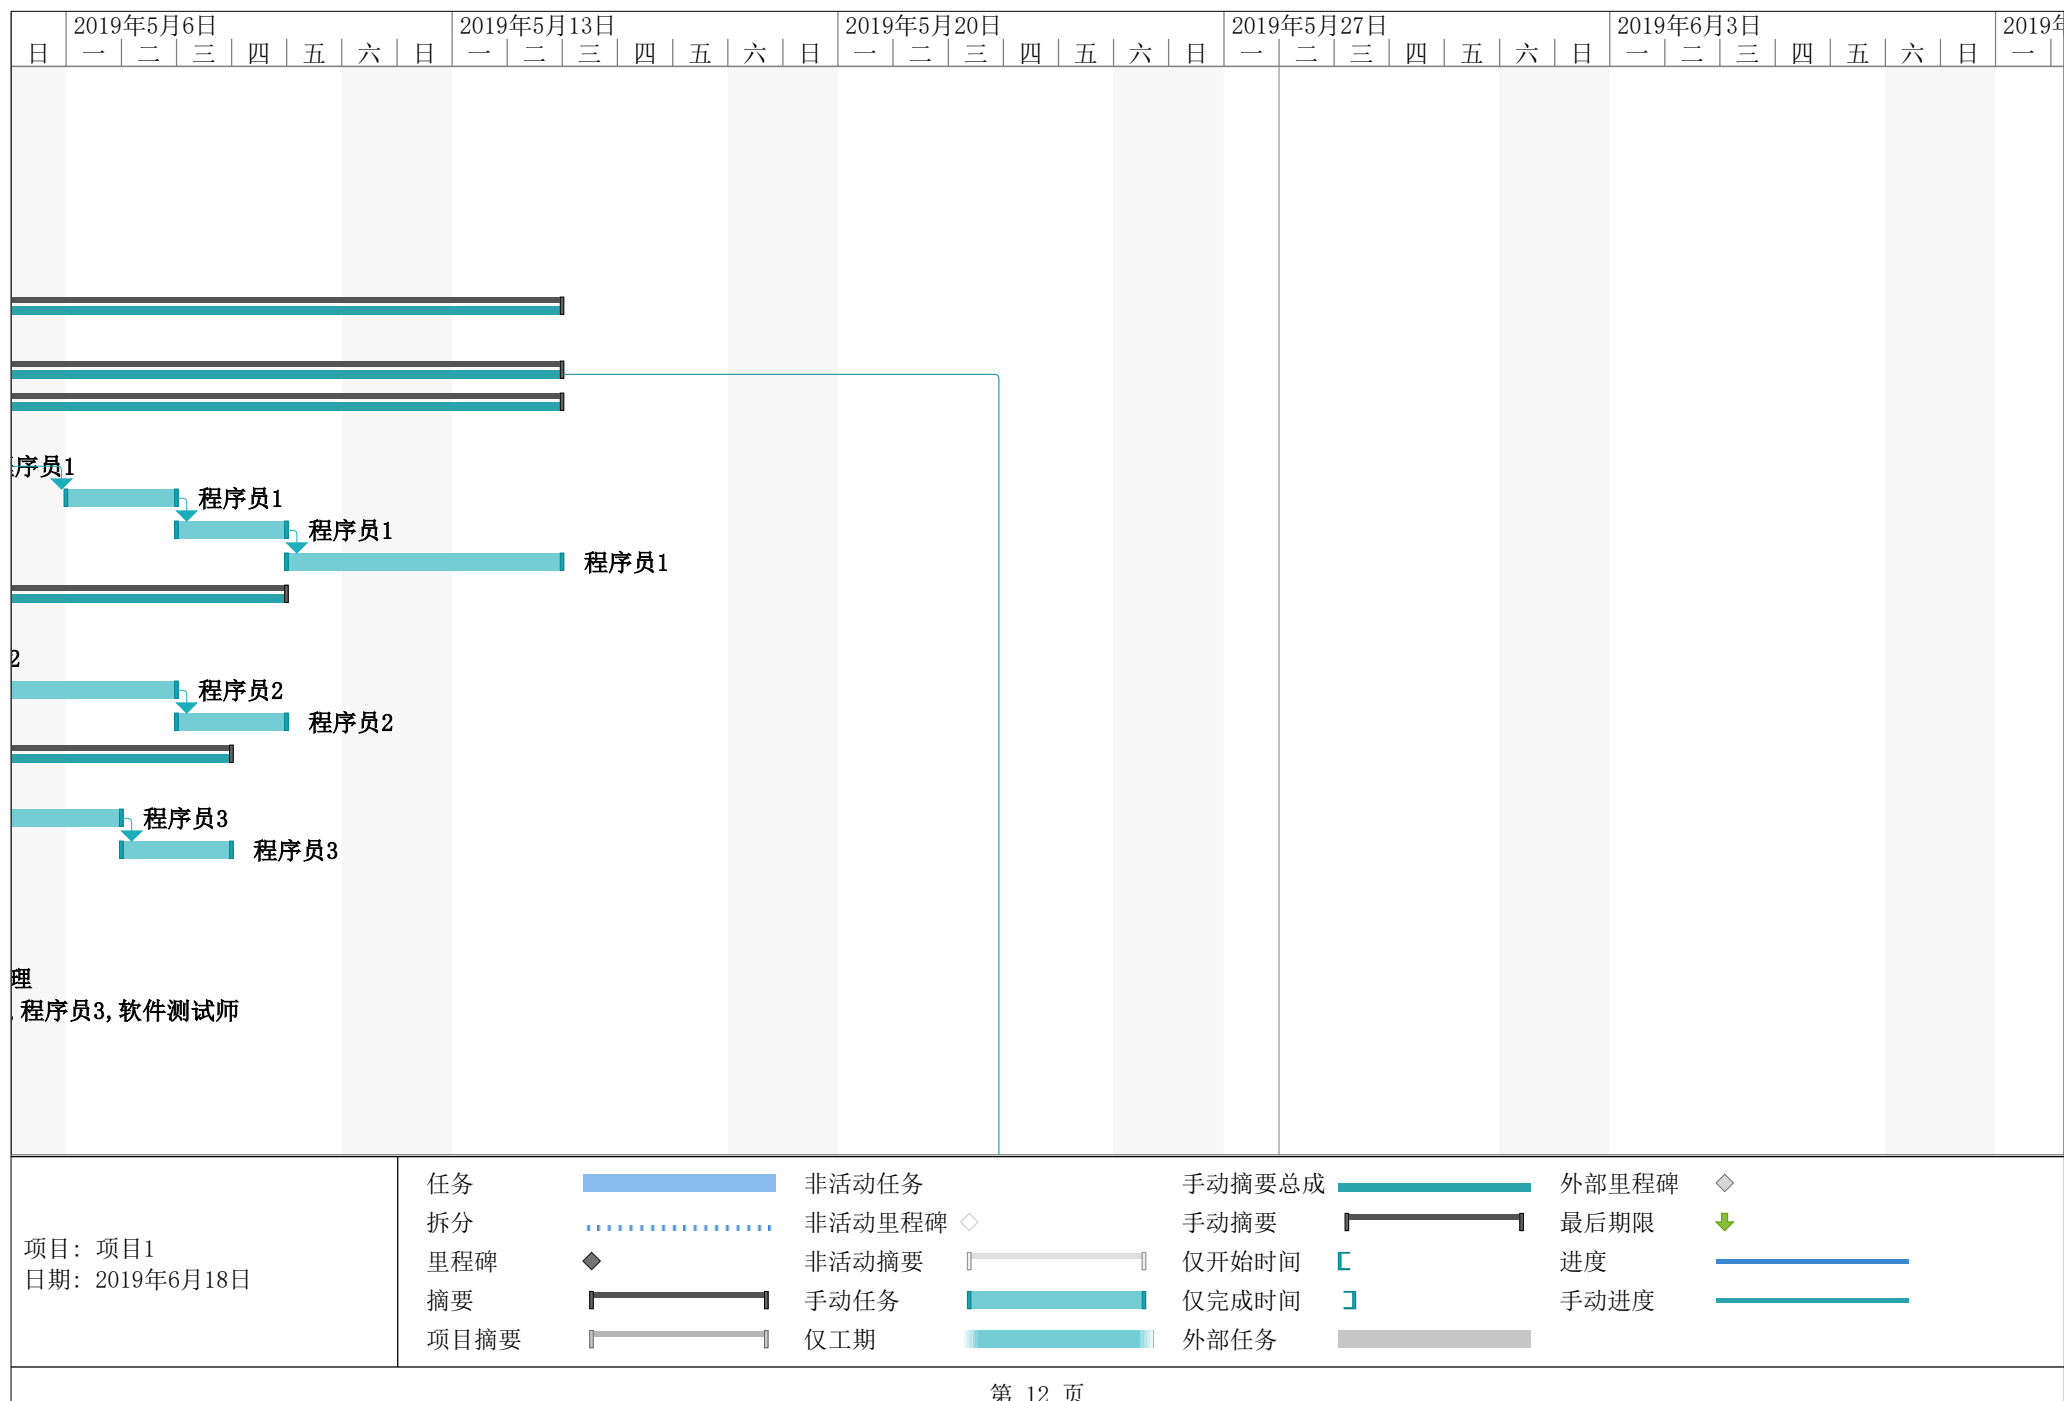

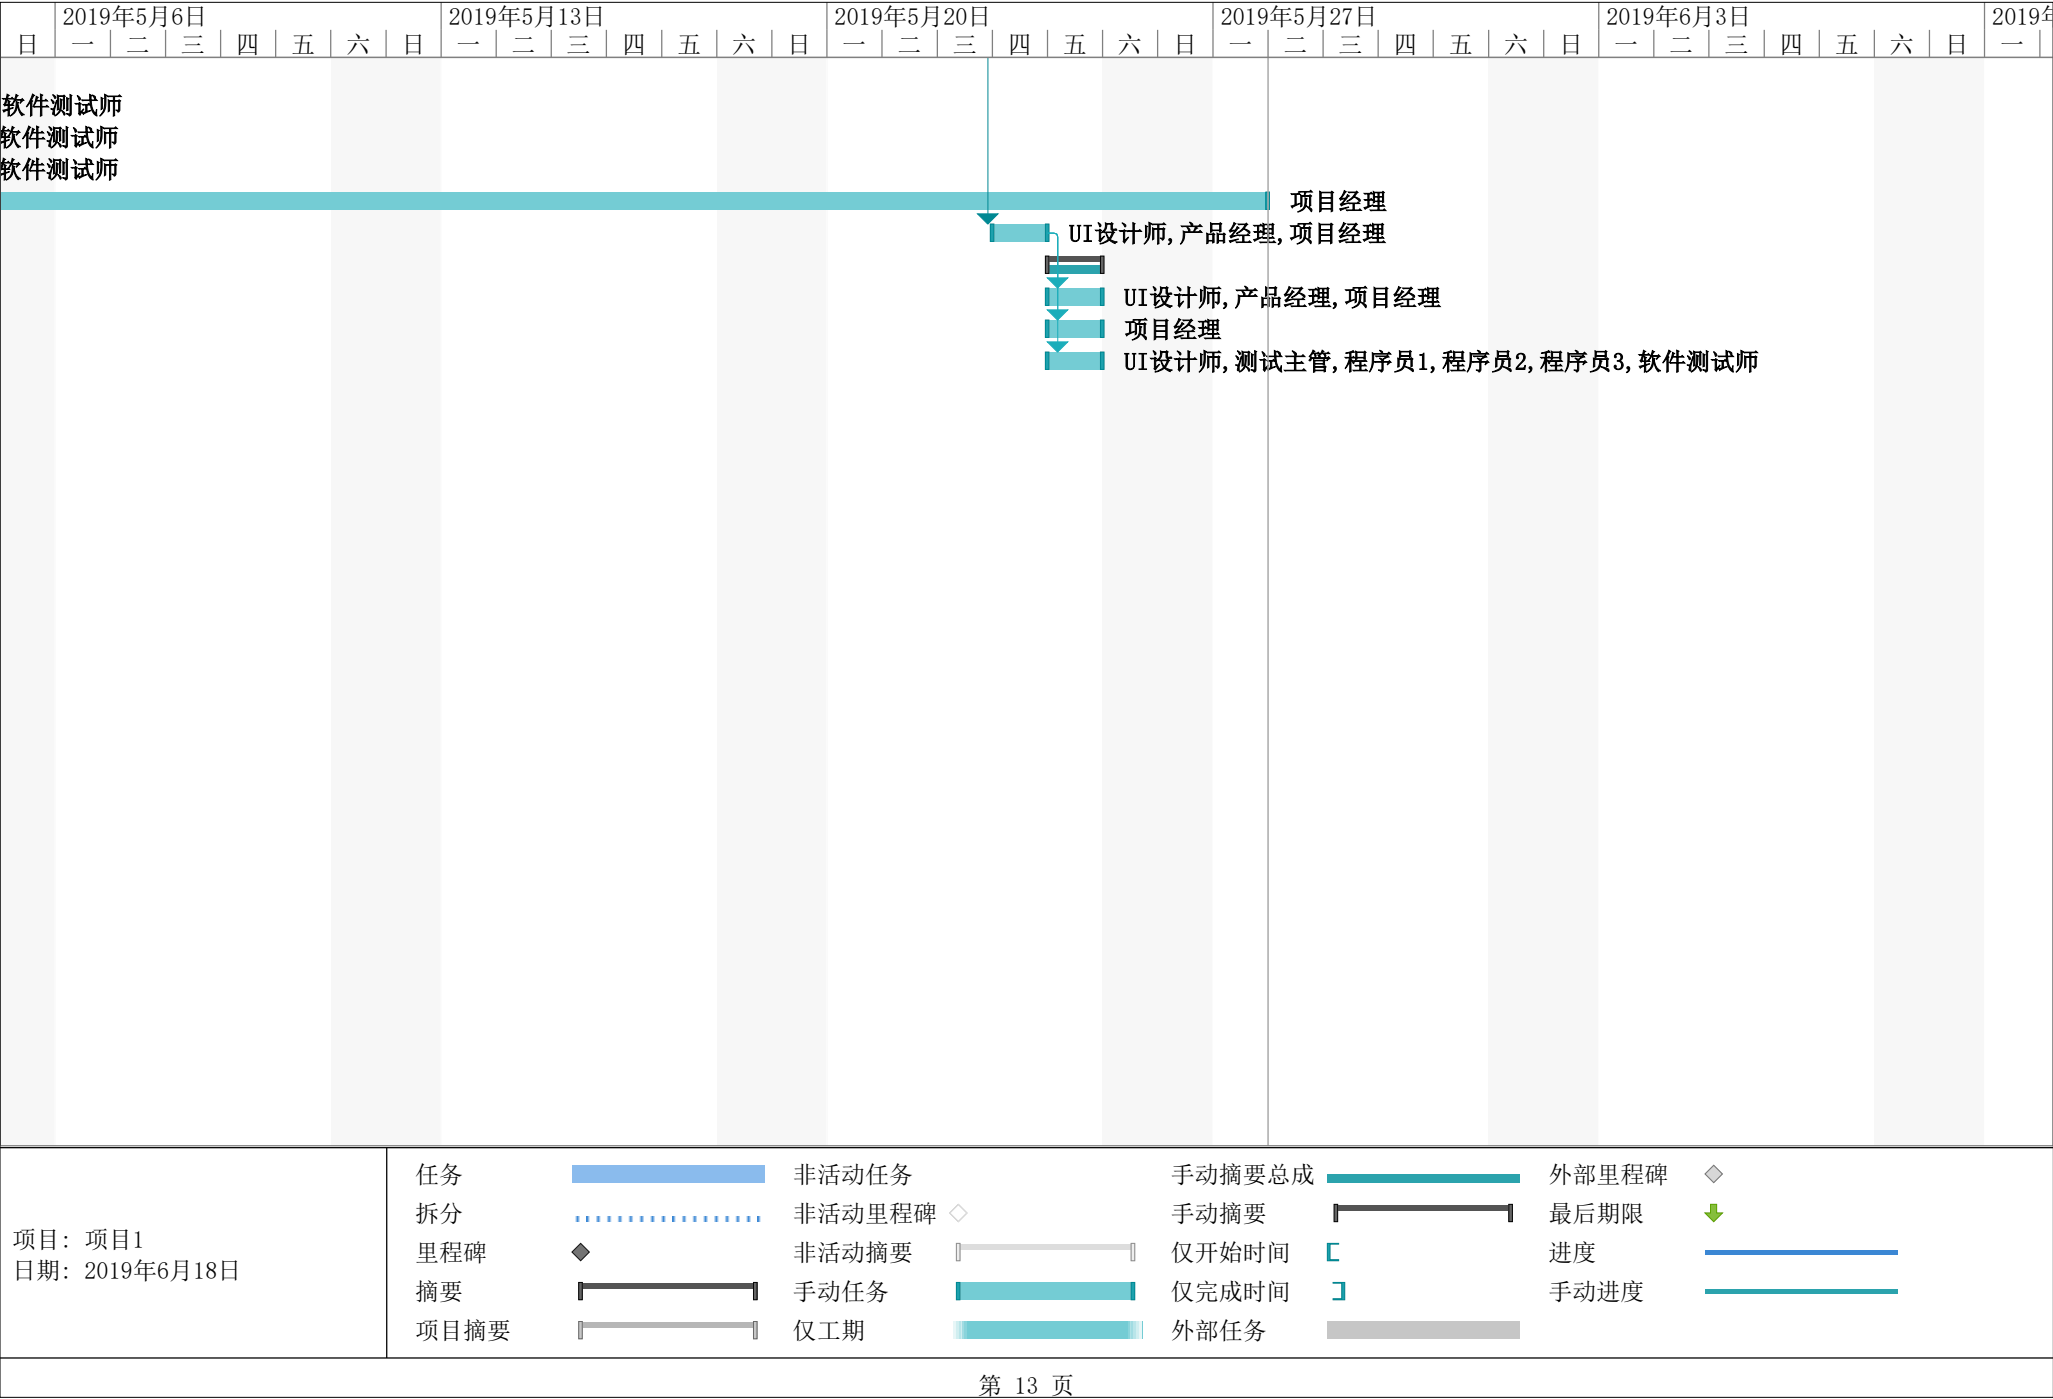

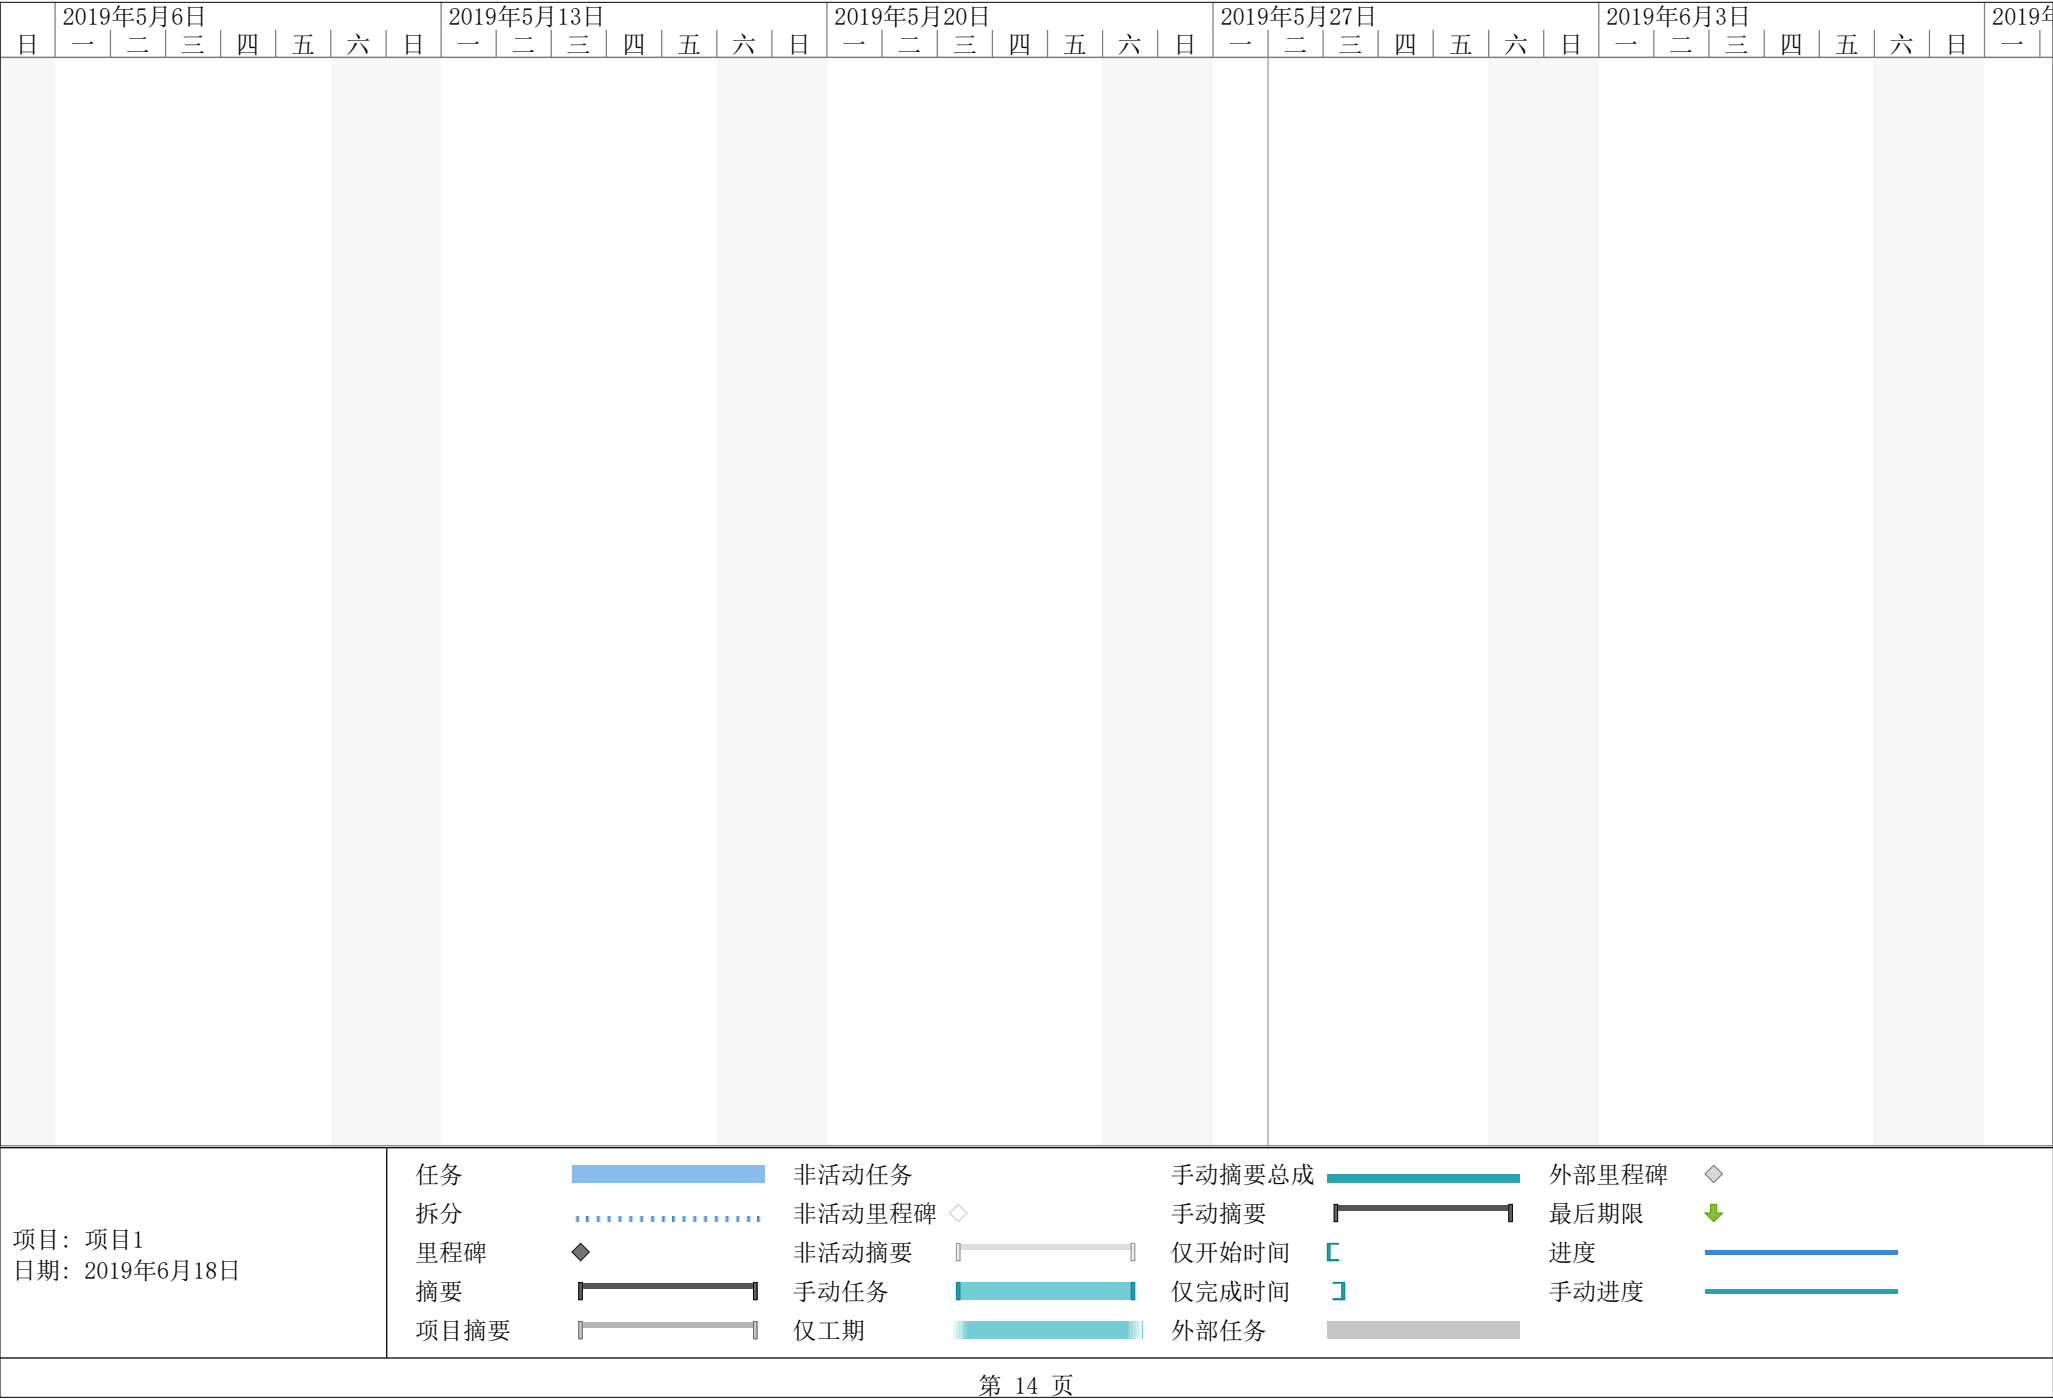

2019年5月6日							2019年5月13日							2019年5月20日							2019年5月27日							2019年6月3日							2019年6月10日		
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	
<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月18日</div>							<div><div><div>任务</div><div>拆分</div><div>里程碑</div><div>摘要</div><div>项目摘要</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>非活动任务</div><div>非活动里程碑</div><div>非活动摘要</div><div>手动任务</div><div>仅工期</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>手动摘要总成</div><div>手动摘要</div><div>仅开始时间</div><div>仅完成时间</div><div>外部任务</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>外部里程碑</div><div>最后期限</div><div>进度</div><div>手动进度</div></div></div></div></div></div>																														

第 15 页
