

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月11日			
							四	五	六	日
1		3.1 “约饭” APP	3 个工作日	2019年3月9日	2019年3月12日					
2		启动	3 个工作日	2019年3月9日	2019年3月12日					
3		任命项目经理	1 个工作日	2019年3月9日	2019年3月9日					
4		组建核心团队	1 个工作日	2019年3月9日	2019年3月9日					
5		干系人分析	1 个工作日	2019年3月9日	2019年3月9日					
6		里程碑计划	1 个工作日	2019年3月9日	2019年3月9日					
7		制定项目章程	1 个工作日?	2019年3月11日	2019年3月11日	4, 5, 6				
8		项目启动大会	1 个工作日?	2019年3月12日	2019年3月12日	7				
9		规划	29 个工作日	2019年3月13日	2019年4月22日					
10		规划范围	13 个工作日	2019年3月13日	2019年3月29日					
11		制定需求说明书	5 个工作日	2019年3月13日	2019年3月19日	8				
12		界面设计	5 个工作日?	2019年3月20日	2019年3月26日	11				
13		详细设计说明书	5 个工作日?	2019年3月20日	2019年3月26日	11				
14		范围说明书	3 个工作日?	2019年3月22日	2019年3月26日	11				
15		创建WBS	2 个工作日?	2019年3月27日	2019年3月28日	12, 13, 14				
16		形成范围基准	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日	15				
17		规划时间	6 个工作日	2019年3月30日	2019年4月5日					
18		排列工作包顺序	1 个工作日?	2019年3月30日	2019年3月30日	16				
19		估算资源	2 个工作日?	2019年4月1日	2019年4月2日	18				
20		估算持续时间	2 个工作日?	2019年4月2日	2019年4月3日	19				
21		制定进度计划	1 个工作日?	2019年4月4日	2019年4月4日	20				
22		形成层进度基准	1 个工作日?	2019年4月5日	2019年4月5日	21				
23		规划成本	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日					
24		项目成本估算	3 个工作日?	2019年4月8日	2019年4月10日	22				
25		项目预算	2 个工作日?	2019年4月11日	2019年4月12日	24				
26		规划质量	8 个工作日	2019年4月1日	2019年4月10日					
27		制定测试计划	2 个工作日?	2019年4月1日	2019年4月2日	16				
28		制定测试用例	6 个工作日?	2019年4月3日	2019年4月10日	27				
29		规划人力资源	4 个工作日	2019年4月8日	2019年4月11日					
30		制定人力资源计划	2 个工作日?	2019年4月8日	2019年4月9日	17				
31		制定人员配备管理计	2 个工作日?	2019年4月10日	2019年4月11日	30				
32		规划沟通	2 个工作日	2019年4月12日	2019年4月15日					
33		制定沟通计划	2 个工作日?	2019年4月12日	2019年4月15日	31				
34		规划采购	7 个工作日	2019年4月8日	2019年4月16日					
项目：项目1 日期：2019年6月18日		任务	非活动任务	手动摘要	手动摘要	外部里程碑				
		拆分	非活动里程碑	手动摘要	手动摘要	最后期限				
		里程碑	非活动摘要	仅开始时间	仅开始时间	进度				
		摘要	手动任务	仅完成时间	仅完成时间	手动进度				
		项目摘要	仅工期	外部任务	外部任务					

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月11日			
								四	五	六	日
69			团队建设	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日					
70			培训	1 个工作日?	2019年4月26日	2019年4月26日	43				
71			娱乐活动	1 个工作日?	2019年4月26日	2019年4月26日	43				
72			沟通	1 个工作日?	2019年4月26日	2019年4月26日	43				
73			采购	20 个工作日	2019年4月30日	2019年5月27日	43				
74			项目验收	1 个工作日?	2019年5月23日	2019年5月23日	44				
75			收尾	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日					
76			项目终验	1 个工作日?	2019年5月24日	2019年5月24日	74				
77			结束采购	1 个工作日?	2019年5月24日	2019年5月24日	74				
78		项目内部收尾	1 个工作日?	2019年5月24日	2019年5月24日	74					
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											

项目：项目1

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务



































外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 3 页

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月11日			
								四	五	六	日
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											

项目：项目1

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑


最后期限

进度

手动进度

第 4 页

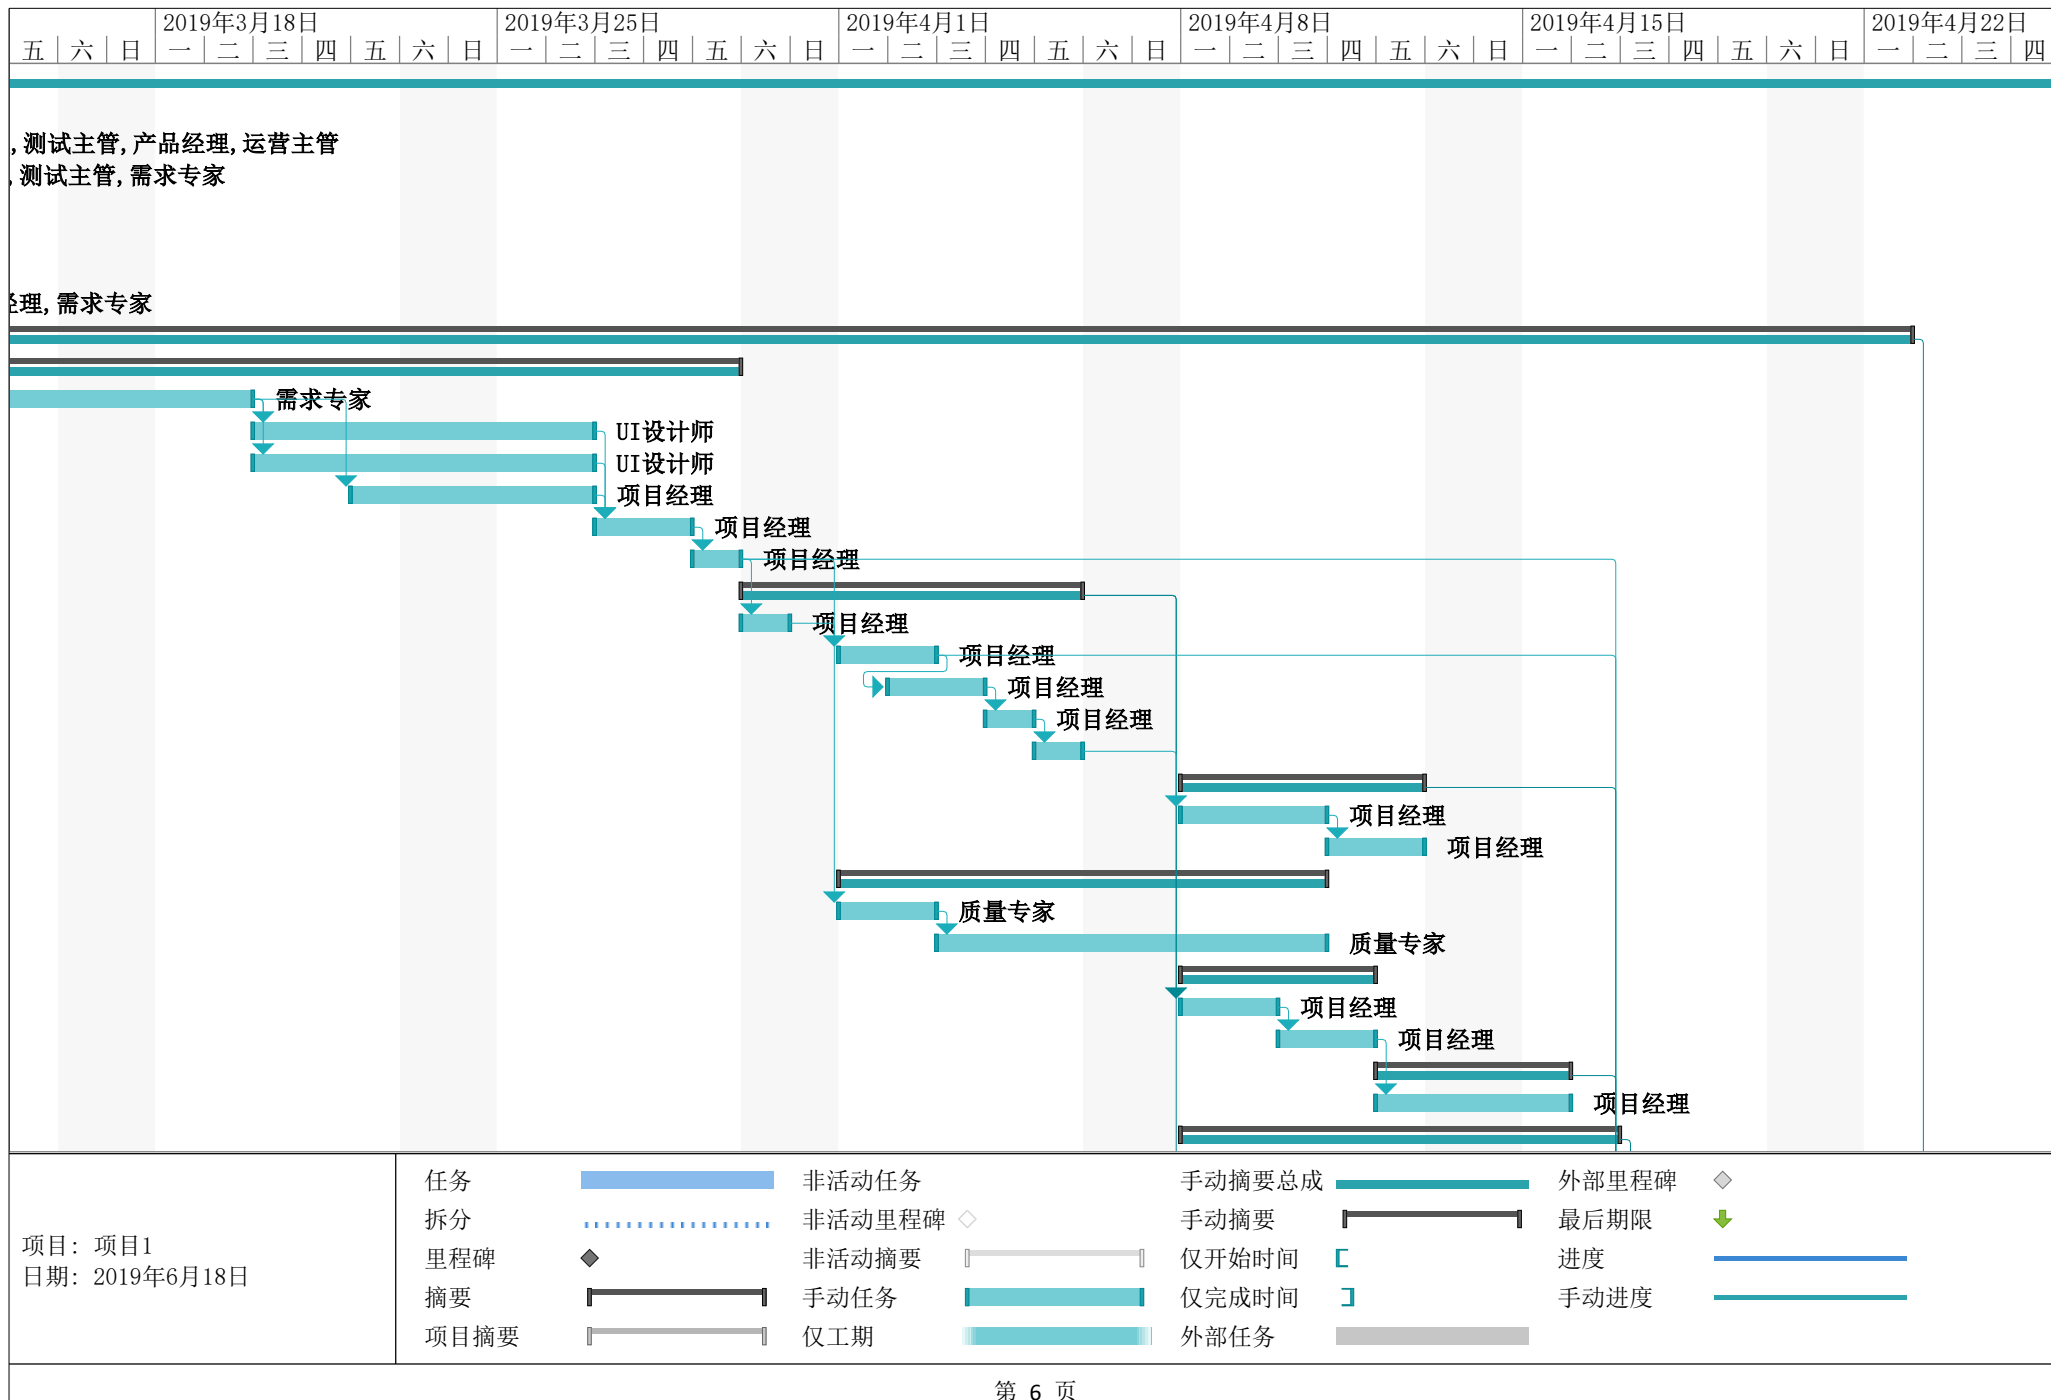

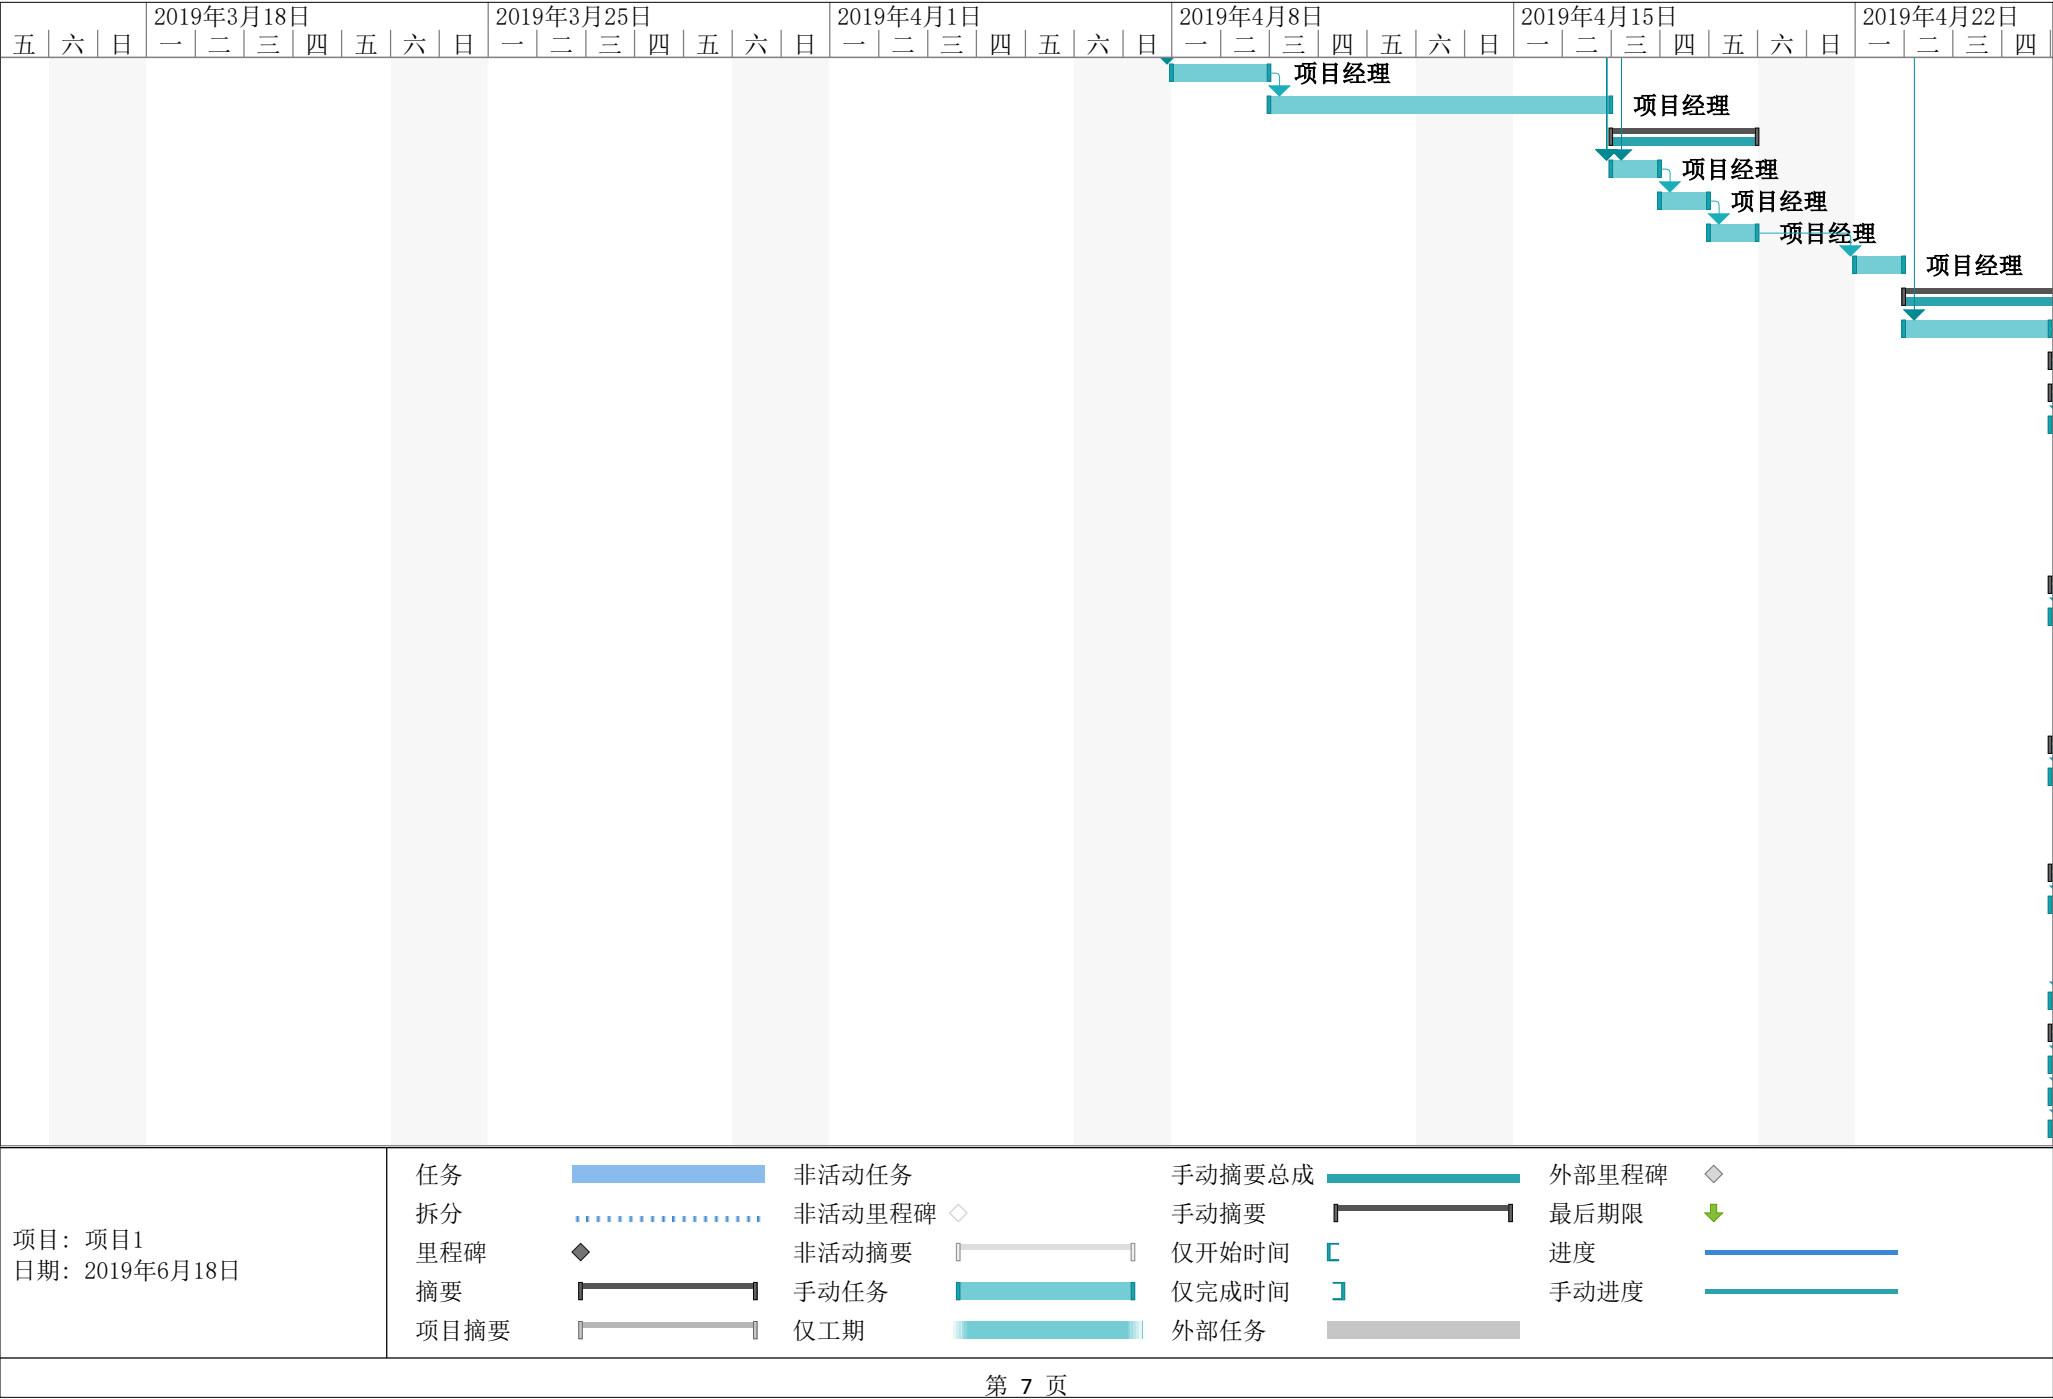


五 六 日			2019年3月18日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月25日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月1日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月8日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月15日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月22日 一 二 三 四			
项目：项目1 日期：2019年6月18日			任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑																																
			拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限																																
			里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度																																
			摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度																																
			项目摘要		仅工期		外部任务																																		
第 8 页																																									


五 六 日			2019年3月18日 一 二 三 四 五 六 日							2019年3月25日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月1日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月8日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月15日 一 二 三 四 五 六 日							2019年4月22日 一 二 三 四 五 六 日						
项目：项目1 日期：2019年6月18日			任务	<div></div>			非活动任务							手动摘要总成				<div></div>			外部里程碑				<div></div>																			
			拆分	<div></div>			非活动里程碑				<div></div>			手动摘要			<div></div>			最后期限				<div></div>																				
			里程碑	<div></div>			非活动摘要				<div></div>			仅开始时间			<div></div>			进度				<div></div>																				
			摘要	<div></div>			手动任务				<div></div>			仅完成时间			<div></div>			手动进度				<div></div>																				
			项目摘要	<div></div>			仅工期				<div></div>			外部任务			<div></div>																											
第 9 页																																												







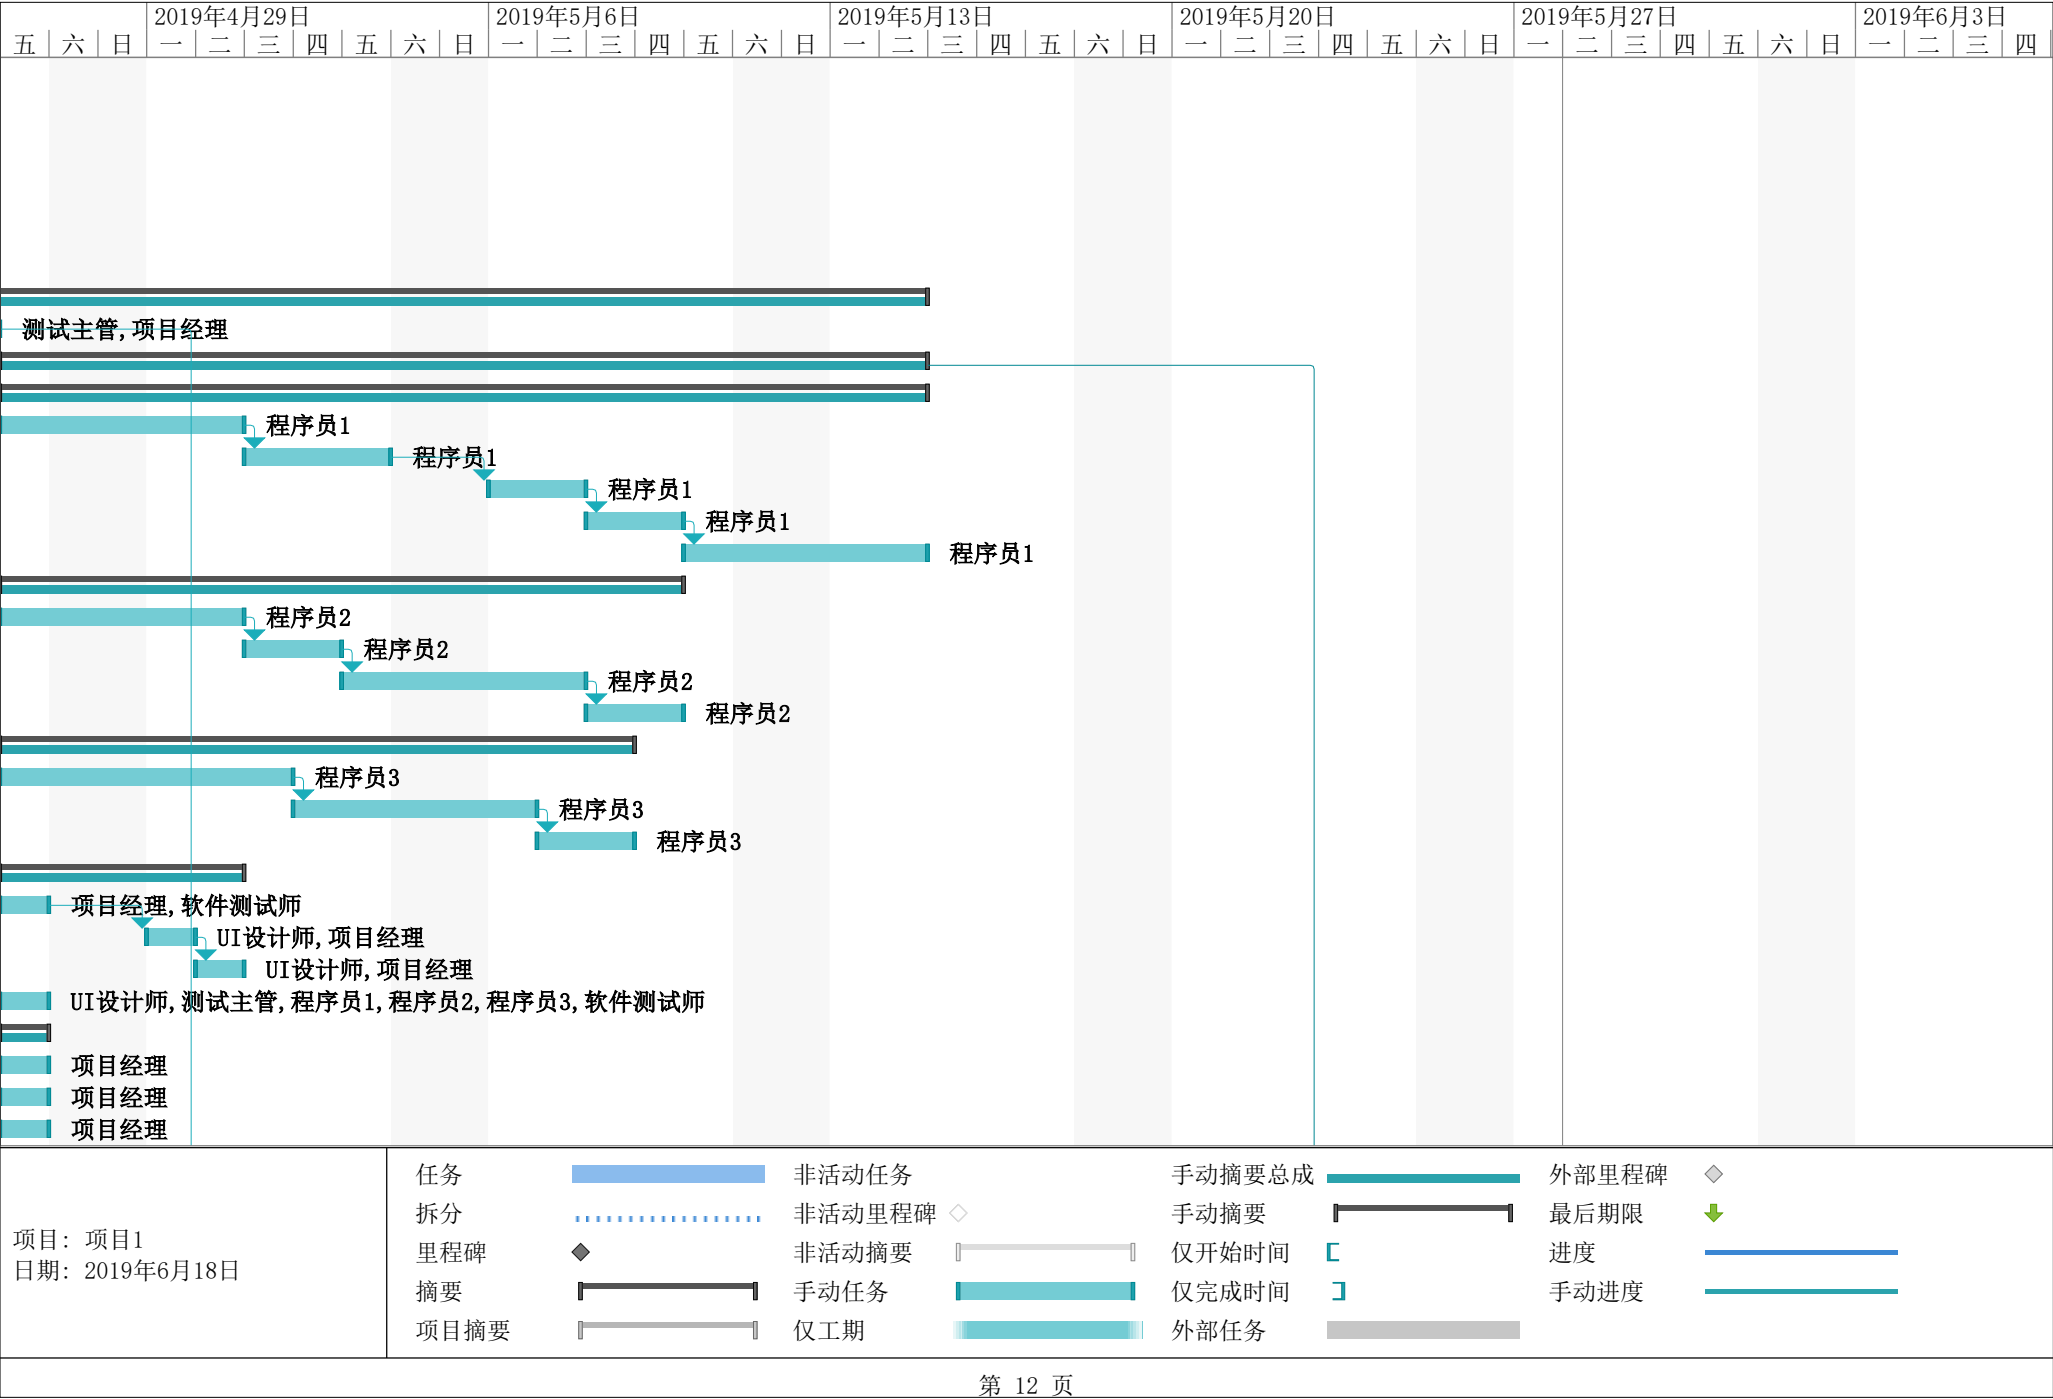

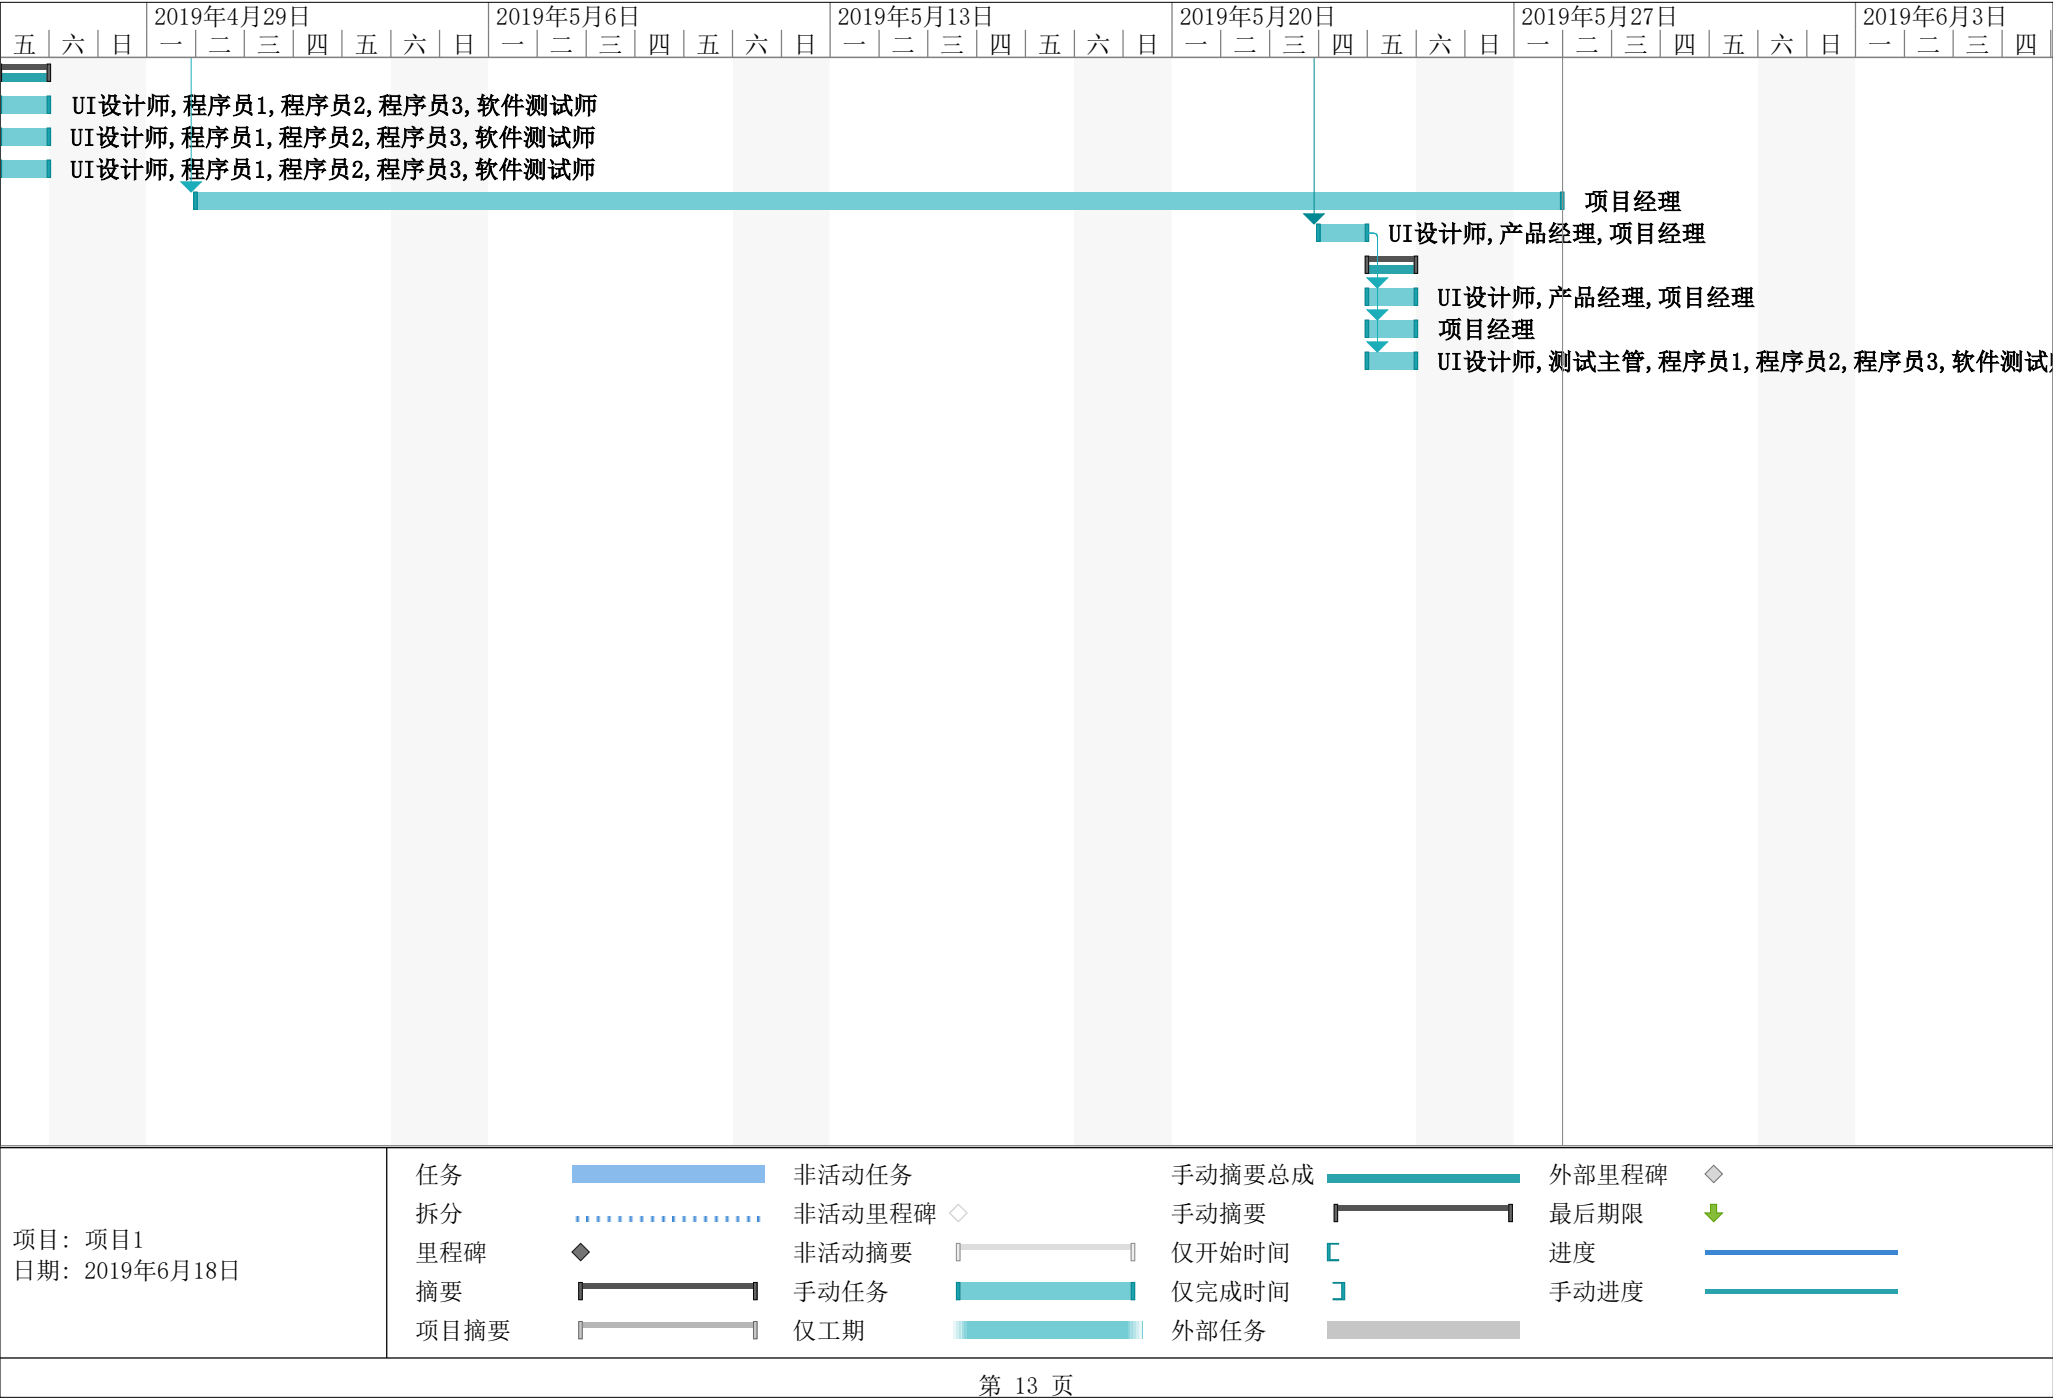









[illegible]

五			六			日			2019年4月29日							2019年5月6日							2019年5月13日							2019年5月20日							2019年5月27日							2019年6月3日															
一			二			三			四			五			六			日			一			二			三			四			五			六			日			一			二			三			四								
<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月18日</div>									任务		<div></div>							非活动任务							手动摘要总成							<div></div>							外部里程碑							<div></div>													
									拆分		<div></div>							非活动里程碑							<div></div>							手动摘要							<div></div>							最后期限							<div></div>						
									里程碑		<div></div>							非活动摘要							<div></div>							仅开始时间							<div></div>							进度							<div></div>						
									摘要		<div></div>							手动任务							<div></div>							仅完成时间							<div></div>							手动进度							<div></div>						
									项目摘要		<div></div>							仅工期							<div></div>							外部任务							<div></div>																				

第 11 页





五 六 日			2019年4月29日 一 二 三 四 五 六 日							2019年5月6日 一 二 三 四 五 六 日							2019年5月13日 一 二 三 四 五 六 日							2019年5月20日 一 二 三 四 五 六 日							2019年5月27日 一 二 三 四 五 六 日							2019年6月3日 一 二 三 四 五 六 日						
项目：项目1 日期：2019年6月18日			任务				非活动任务						手动摘要总成						外部里程碑																									
			拆分				非活动里程碑						手动摘要						最后期限																									
			里程碑				非活动摘要						仅开始时间						进度																									
			摘要				手动任务						仅完成时间						手动进度																									
			项目摘要				仅工期						外部任务																															
第 14 页																																												

[illegible]
