



标识号	Ð	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五 六	2019年3月	11日 三 四 五 <i>j</i>	2019年3月1
17	Ť	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年3月30日	2019年3月30日	15	11. /\	H —	<u> </u>	V
18	•	*	估算资源	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	17				
19	Ť	*	估算持续时间	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日	18				
20		*	制定进度计划	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	19				
21		*	形成层进度基准	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	20				
22		*	规划成本	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日					
23	Ť	*	项目成本估算	3 个工作日	2019年4月8日	2019年4月10日	21				
24	Ť	*	项目预算	2 个工作日	2019年4月11日	2019年4月12日	23				
25		*	规划质量	8 个工作日	2019年4月1日	2019年4月10日					
26		*	制定测试计划	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	15				
27		*	制定测试用例	6 个工作日	2019年4月3日	2019年4月10日	26				
28		*	规划人力资源	4 个工作日	2019年4月8日	2019年4月11日					
29	Ť	*	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	16				
30	•	*	制定人员配备管理计划	2 个工作 日?	2019年4月10日	2019年4月11日	29				
31		*	规划沟通		2019年4月12日	2019年4月15日					
32	•	*	制定沟通计划	2 个工作日	2019年4月12日	2019年4月15日	30				
			任务		非活动任务		手动摘要总成		■ 外部里程碑		
项目:			拆分 里程碑		非活动里程碑 非活动摘要		手动摘要 工 仅开始时间 工		■ 最后期限 进度	+	
日期:	2019	9年6月19日	摘要	·	── 手动任务	u u	仅完成时间]		手动进度		
			项目摘要		一 仅工期		外部任务				
			<u>, </u>			第 2 页					


标识号	任务模式	式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	#	六 日	2019年3月1	1日 三 四 五	六 日	2019年3月1
33	*	规划采购	7 个工作	日2019年4月8日	2019年4月16日			/ \ H	- -	_	<u>/ </u>	
34	*	自制外购分析	2 个工作	日 2019年4月8日	2019年4月9日	16						
35	*	制定采购文件	5 个工作	日 2019年4月10日	2019年4月16日	34						
36	*	规划风险	3 个工作	日2019年4月17日	2019年4月19日							
37	*	识别风险	1 个工作	日 2019年4月17日	2019年4月17日	15, 18, 31, 33, 22						
38	*	风险分析	1 个工作	日 2019年4月18日	2019年4月18日	37						
39	*	制定风险登记册	1 个工作	日 2019年4月19日	2019年4月19日	38						
40	*	规划整合	1 个工作	日 2019年4月22日	2019年4月22日	39						
41	*	执行与监控	16 个工作	E 2019年4月23日	2019年5月14日							
42	*	组建项目团队	3 个工作	日 2019年4月23日	2019年4月25日	8						
43	*	项目执行	13 个工作	2019年4月26日	2019年5月14日							
44	*	用户模块	13 个工作	2019年4月26日	2019年5月14日							
45	*	首页	3 个工作	日 2019年4月26日	2019年4月30日	42						
46	*	注册登录	3 个工作	日 2019年5月1日	2019年5月3日	45						
47	*	下单	2 个工作	日 2019年5月6日	2019年5月7日	46						
48	*	个人配置	2 个工作	日 2019年5月8日	2019年5月9日	47						
项目: 项 日期: 201	目1 19年6月19日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	•	非活动任务 非活动里程确 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务		—1 1	小部里程碑 最后期限 进度 手动进度	♦		
					第 3 页							


标识号	任务模	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五 六	2019年3月	11日 三 四 五 六 I	2019年3月1
49	*	选择"厨师"	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	48	11. / /	<u> </u>	<u> </u>	
50	*	"厨师"模块	10 个工作	[2019年4月26日	2019年5月9日					
51	*	首页	3 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月30日	42				
52	*	接单	2 个工作日	日2019年5月1日	2019年5月2日	51				
53	*	订单处理	3 个工作日	日2019年5月3日	2019年5月7日	52				
54	*	个人配置	2 个工作日	日2019年5月8日	2019年5月9日	53				
55	*	管理员模块	9 个工作日	日2019年4月26日	2019年5月8日					
56	*	"厨师"审核	4 个工作日	2019年4月26日	2019年5月1日	42	-			
57	*	统计分析	3 个工作日	日2019年5月2日	2019年5月6日	56	_			
58	*	备份	2 个工作日	日2019年5月7日	2019年5月8日	57				
59	*	项目监控	3 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月30日		-			
60	*	各项指标监控	1 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月26日	42	-			
61	*	监控评审	1 个工作日	日2019年4月29日	2019年4月29日	60	-			
62	*	变更评审	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	61	-			
63	*	例会	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42				
64	*	管理干系人	1 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月26日					
	1	任务		非活动任务		手动摘要总成		■ 外部里程碑	♦	
项目: 项		斯分 型程碑		非活动里程碑 非活动摘要		手动摘要 【一一 仅开始时间 【		1 最后期限 进度	•	
日期: 201	19年6月19	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	<u> </u>	■ 手动任务	u U	仅完成时间]		近及 手动进度		
		项目摘要		一 仅工期		外部任务				
		,			第 4 页					

标识号	Ð	任务模式	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	T	六 日	2019年3月1	.1日 三 四 五	六 日	2019年3月1
65	Ť	*	发布项目信息	1 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月26日	42	-14	<u>/ </u>	— .	<u> </u>	<u> </u>	-
66	•	*	报告监控指标	1 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月26日	42						
67	•	*	干系人沟通	1 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月26日	42						
68		*	团队建设	1 个工作	日2019年4月26日	2019年4月26日							
69	•	*	培训	1 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月26日	42						
70	•	*	娱乐活动	1 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月26日	42						
71	•	*	沟通	1 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月26日	42						
72	•	*	采购	20 个工作	E2019年4月30日	2019年5月27日	42						
73	•	*	项目验收	1 个工作日	日 2019年5月23日	2019年5月23日	43						
74		*	收尾	1 个工作	日2019年5月24日	2019年5月24日							
75	•	*	项目终验	1 个工作日	日 2019年5月24日	2019年5月24日	73						
76	•	*	结束采购	1 个工作日	日 2019年5月24日	2019年5月24日	73						
77	•	*	项目内部收尾	1 个工作日	日2019年5月24日	2019年5月24日	73						
78		-5											
79		-5											
80		-5											
项目: ^巧 日: ^ぴ		1 年6月19日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	*	非活动任务 非活动里程确 非活动摘要 一 手动任务		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 C 仅完成时间 J 外部任务		j	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	•		
						第 5 页							

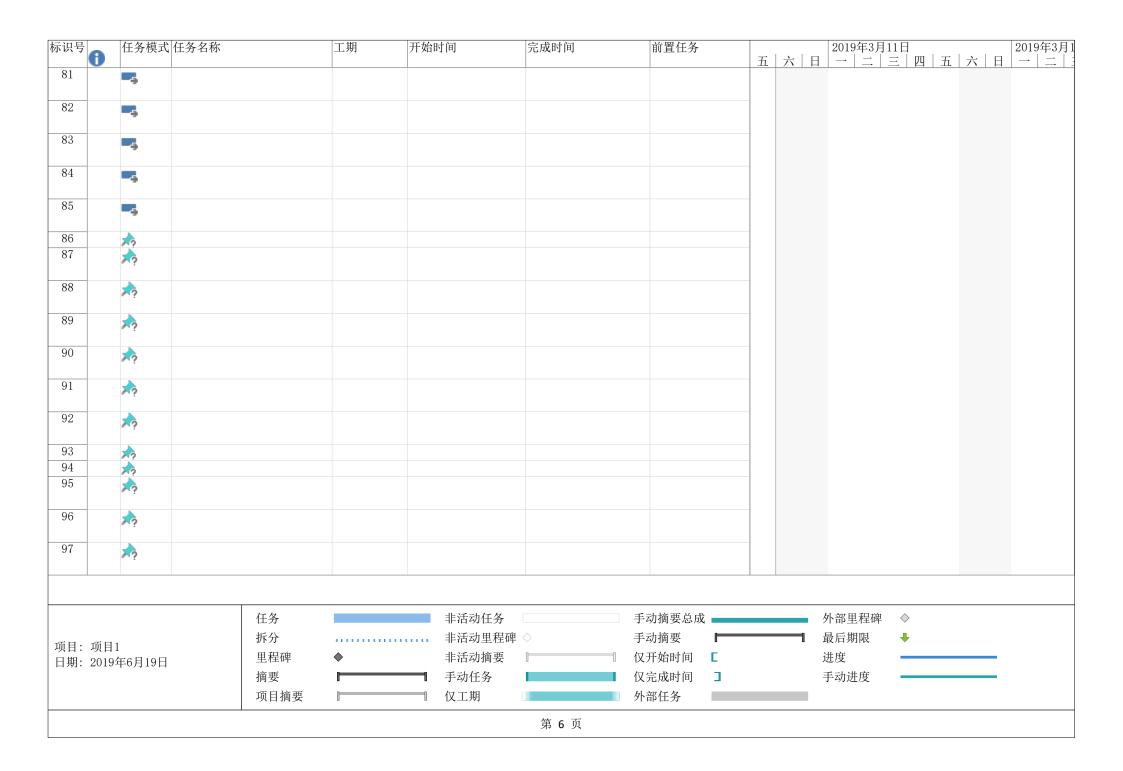

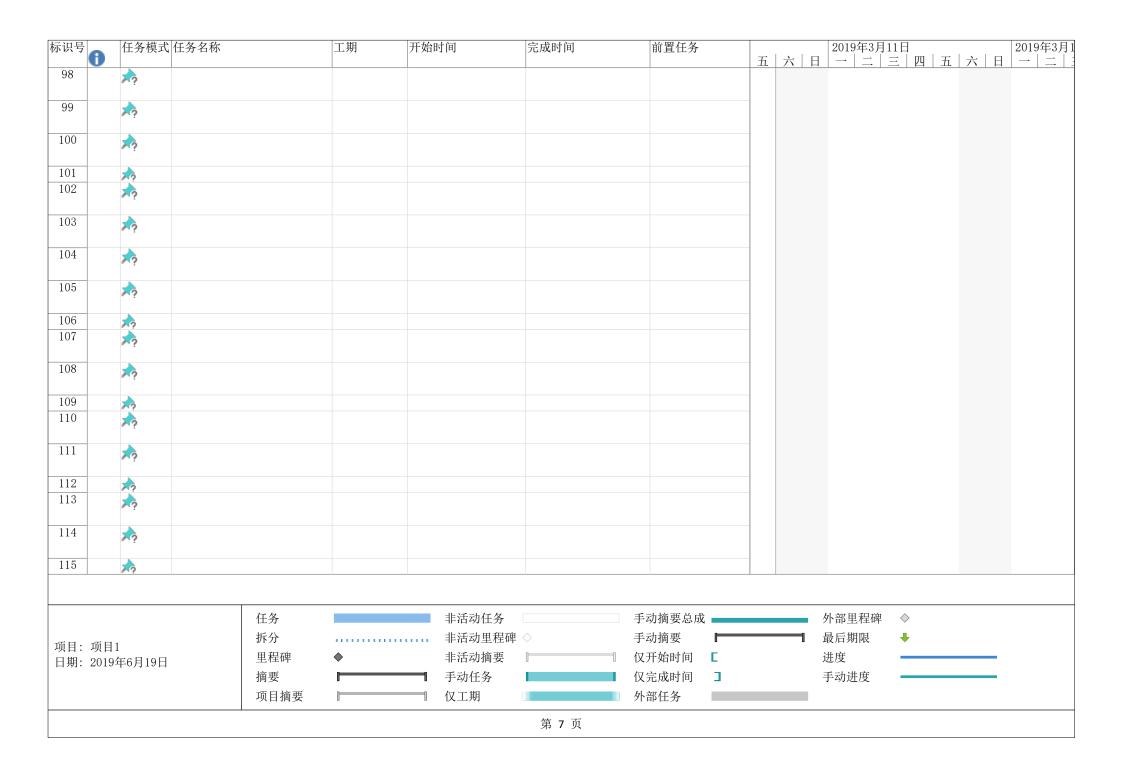

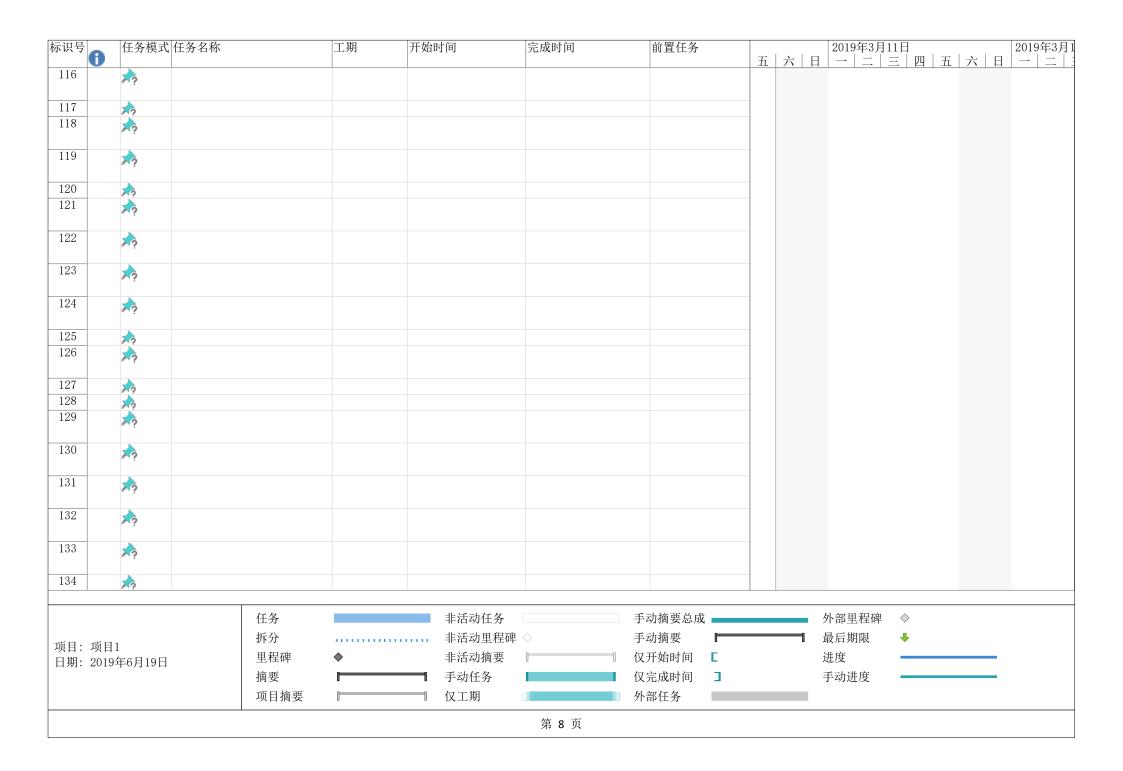

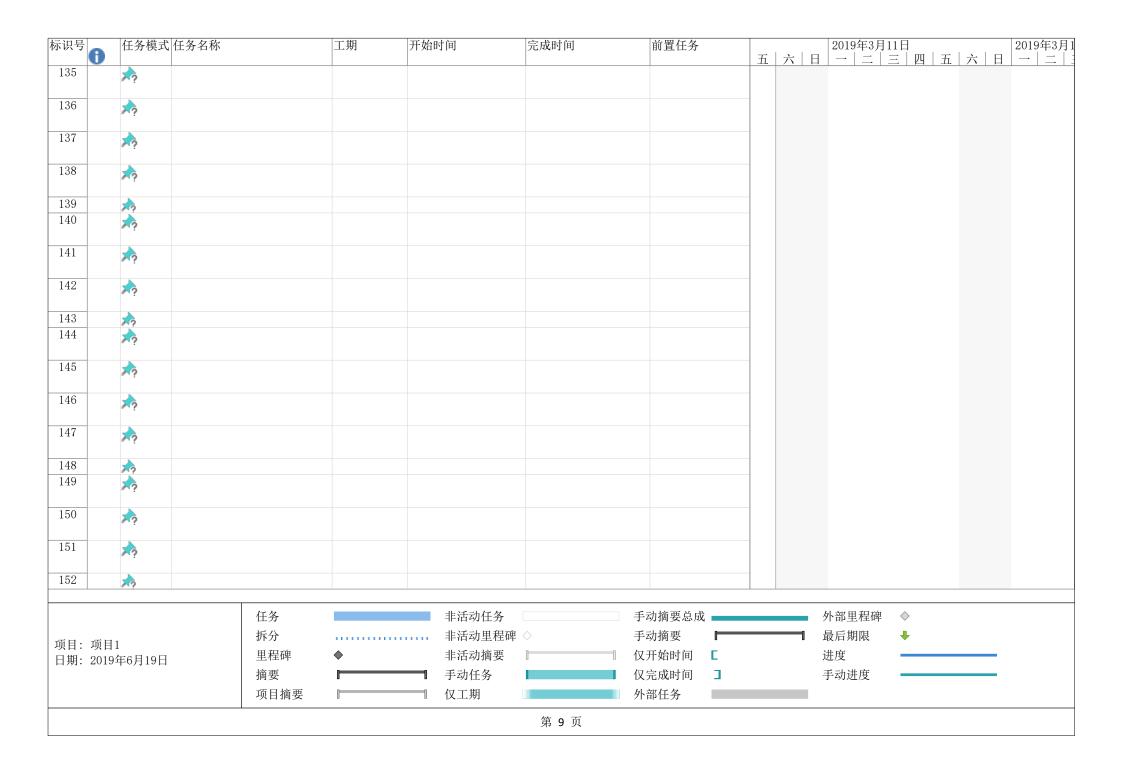

154		任务模式 任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务		# I	六	н	2019年3月	月11日 = m	#	六 日	2019年3月
155	153	*?							-11.	/\	Н		<u> </u>		/	
156	154	*														
157	155	*														
157	156															
16 17 18 18 18 18 18 18 18																
161	157	*?														
161	158	*														
Table Ta	159	*?														
任务	160	*														
任务	161	**														
所目: 项目1 日期: 2019年6月19日																
摘要																
项目摘要	页目: 项目	1	拆分		非活动里程碑	<u> </u>	手动摘要				最	占期限				
	5日: 项目 3期: 2019	1 9年6月19日	拆分 里程碑 摘要		… 非活动里程确 非活动摘要 ■ 手动任务	! <>	手动摘要 仅开始时间 仅完成时间	[最 进	と				

