

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2018年9月17日							
							三	四	五	六	日	一	二	三
1	启动	启动	7 个工作日	2018年9月13日	2018年9月21日									
2	组建核心团队	组建核心团队	1 个工作日	2018年9月13日	2018年9月13日									
3	干系人分析	干系人分析	2 个工作日	2018年9月14日	2018年9月16日									
4	里程碑计划	里程碑计划	1 个工作日	2018年9月17日	2018年9月17日									
5	指定项目章程	指定项目章程	2 个工作日	2018年9月18日	2018年9月19日	2, 3, 4								
6	项目启动大会	项目启动大会	2 个工作日	2018年9月20日	2018年9月21日	5								
7	规划	规划	28 个工作日	2018年9月19日	2018年10月26日									
8	规划范围	规划范围	11 个工作日	2018年9月19日	2018年10月3日									
9	制定需求说明书	制定需求说明书	1 个工作日	2018年9月24日	2018年9月24日	6								
10	界面设计	界面设计	5 个工作日	2018年9月25日	2018年10月1日	9								
11	详细设计说明书	详细设计说明书	2 个工作日	2018年9月25日	2018年9月26日	9								
12	范围说明书	范围说明书	2 个工作日	2018年9月25日	2018年9月26日	9								
13	创建WBS	创建WBS	1 个工作日	2018年10月2日	2018年10月2日	11, 10, 12								
14	形成范围基准	形成范围基准	1 个工作日	2018年10月3日	2018年10月3日	13								
15	规划时间	规划时间	7 个工作日	2018年10月2日	2018年10月10日									
16	排列工作包顺序	排列工作包顺序	1 个工作日	2018年10月4日	2018年10月4日	14								
17	估算资源	估算资源	1 个工作日	2018年10月5日	2018年10月5日	16								
18	估算持续时间	估算持续时间	1 个工作日	2018年10月6日	2018年10月6日									
19	制定进度计划	制定进度计划	2 个工作日	2018年10月7日	2018年10月8日									
20	形成进度基准	形成进度基准	1 个工作日	2018年10月2日	2018年10月2日									
21	规划成本	规划成本	2 个工作日	2018年10月4日	2018年10月5日									
22	项目成本估计	项目成本估计	1 个工作日	2018年10月4日	2018年10月4日									
23	项目预算	项目预算	1 个工作日	2018年10月5日	2018年10月5日									
24	规划质量	规划质量	2 个工作日	2018年10月6日	2018年10月8日									
25	制定测试计划	制定测试计划	1 个工作日	2018年9月28日	2018年9月28日	16								
26	指定测试用例	指定测试用例	2 个工作日	2018年10月6日	2018年10月8日									
27	规划人力资源	规划人力资源	3 个工作日	2018年10月7日	2018年10月9日									
28	制定人力资源计划	制定人力资源计划	1 个工作日	2018年10月7日	2018年10月7日									
29	制定人员配备管理计划	制定人员配备管理计划	2 个工作日	2018年10月8日	2018年10月9日	28								
30	规划沟通	规划沟通	1 个工作日	2018年10月10日	2018年10月10日									
31	制定沟通管理计划	制定沟通管理计划	1 个工作日	2018年10月10日	2018年10月10日									

10日

三

四

五

六

日

2018年9月17日

一

二

三




















四

项目经理, UI专家


















项目经理






















项目经理

项目

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2018年10月					2018年9月17日			
							三	四	五	六	日	一	二	三	四
32	★	规划采购	3 个工作日	2018年10月12日	2018年10月16日										
33	★	制定采购分析	1 个工作日	2018年10月11日	2018年10月11日										
34	★	制定采购文件	3 个工作日	2018年10月12日	2018年10月16日	33									
35	★	规划风险	8 个工作日	2018年10月17日	2018年10月26日										
36	★	识别风险	2 个工作日	2018年10月17日	2018年10月18日										
37	★	风险分析	3 个工作日	2018年10月19日	2018年10月23日	36									
38	★	制定风险登记册	1 个工作日	2018年10月24日	2018年10月24日	37									
39	★	规划整合	2 个工作日	2018年10月25日	2018年10月26日										
40	★	执行与监控	24 个工作日	2018年10月27日	2018年11月28日										
41	★	组建项目团队	1 个工作日	2018年10月27日	2018年10月27日										
42	★	项目执行	13 个工作日	2018年10月28日	2018年11月13日										
43	★	公共模块	3 个工作日	2018年10月28日	2018年10月30日										
44	★	广告	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41									
45	★	每日促销活动	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44									
46	★	星级大厨推荐	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44									
47	★	“大厨”模块	6 个工作日	2018年10月30日	2018年11月6日										
48	★	厨师审核	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41									
49	★	厨师分类	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	48									
50	★	厨师级别	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	48									
51	★	订单处理	3 个工作日	2018年10月31日	2018年11月2日	50									
52	★	查看历史订单	2 个工作日	2018年11月5日	2018年11月6日	51									
53	★	“消费者”模块	3 个工作日	2018年11月7日	2018年11月9日										
54	★	口味分析及推荐	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41									
55	★	订单处理	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	54									
56	★	查看历史订单	1 个工作日	2018年10月31日	2018年10月31日	55									
57	★	管理员模块	3 个工作日	2018年11月10日	2018年11月13日										
58	★	厨师审核	1 个工作日	2018年10月29日	2018年10月29日	41									
59	★	分析数据	1 个工作日	2018年11月12日	2018年11月12日	52, 56									
60	★	广告管理	1 个工作日	2018年10月30日	2018年10月30日	44									
61	★	新鲜蔬菜管理	1 个工作日	2018年11月13日	2018年11月13日										
62	★	项目监控	5 个工作日	2018年11月14日	2018年11月20日										

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑		
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	10日 三	四	五	六	日	2018年9月17日 一	二	三	四
63		 各项指标监控	1 个工作日	2018年11月14日	2018年11月14日										
64		 监控评审	2 个工作日	2018年11月15日	2018年11月16日	63									
65		 变更评审	1 个工作日	2018年11月19日	2018年11月19日	64									
66		 例会	1 个工作日	2018年11月20日	2018年11月20日										
67		 管理干系人	3 个工作日	2018年11月21日	2018年11月23日										
68		 发布项目信息	1 个工作日	2018年11月21日	2018年11月21日										
69		 报告监控指标	1 个工作日	2018年11月22日	2018年11月22日										
70		 干系人沟通	1 个工作日	2018年11月23日	2018年11月23日	69									
71		 团队建设	2 个工作日	2018年11月24日	2018年11月26日										
72		 培训	1 个工作日	2018年11月24日	2018年11月24日										
73		 娱乐活动	1 个工作日	2018年11月25日	2018年11月25日										
74		 沟通	1 个工作日	2018年11月26日	2018年11月26日										
75		 采购	1 个工作日	2018年11月27日	2018年11月27日										
76		 项目验收	1 个工作日	2018年11月28日	2018年11月28日										
77		 收尾	2 个工作日	2018年11月28日	2018年11月29日										
78		 项目终验	1 个工作日	2018年11月29日	2018年11月29日	76									
79		 结束采购	2 个工作日	2018年11月28日	2018年11月29日	75									
80		 项目内部收尾	1 个工作日	2018年11月29日	2018年11月29日	76									

项目：项目1

日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度











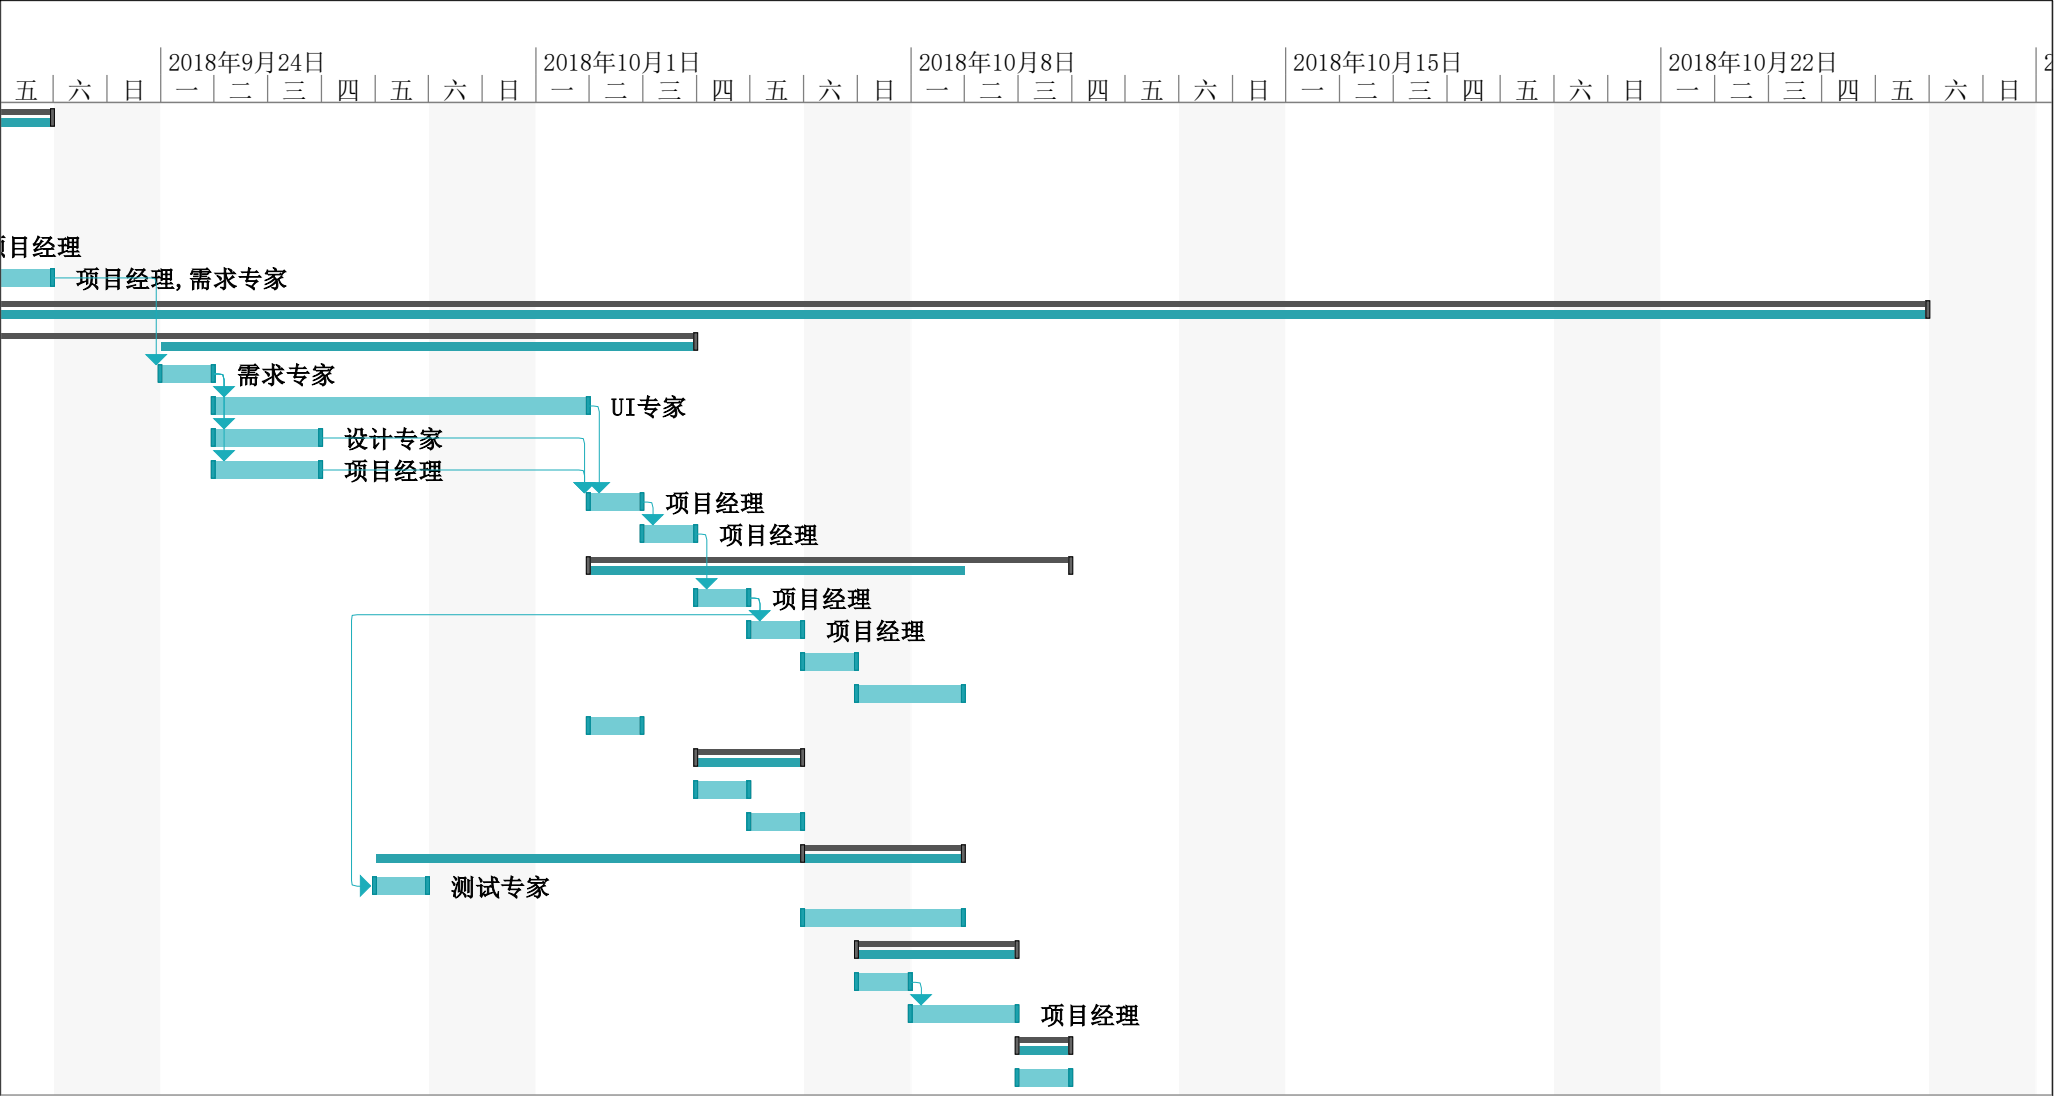



项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			

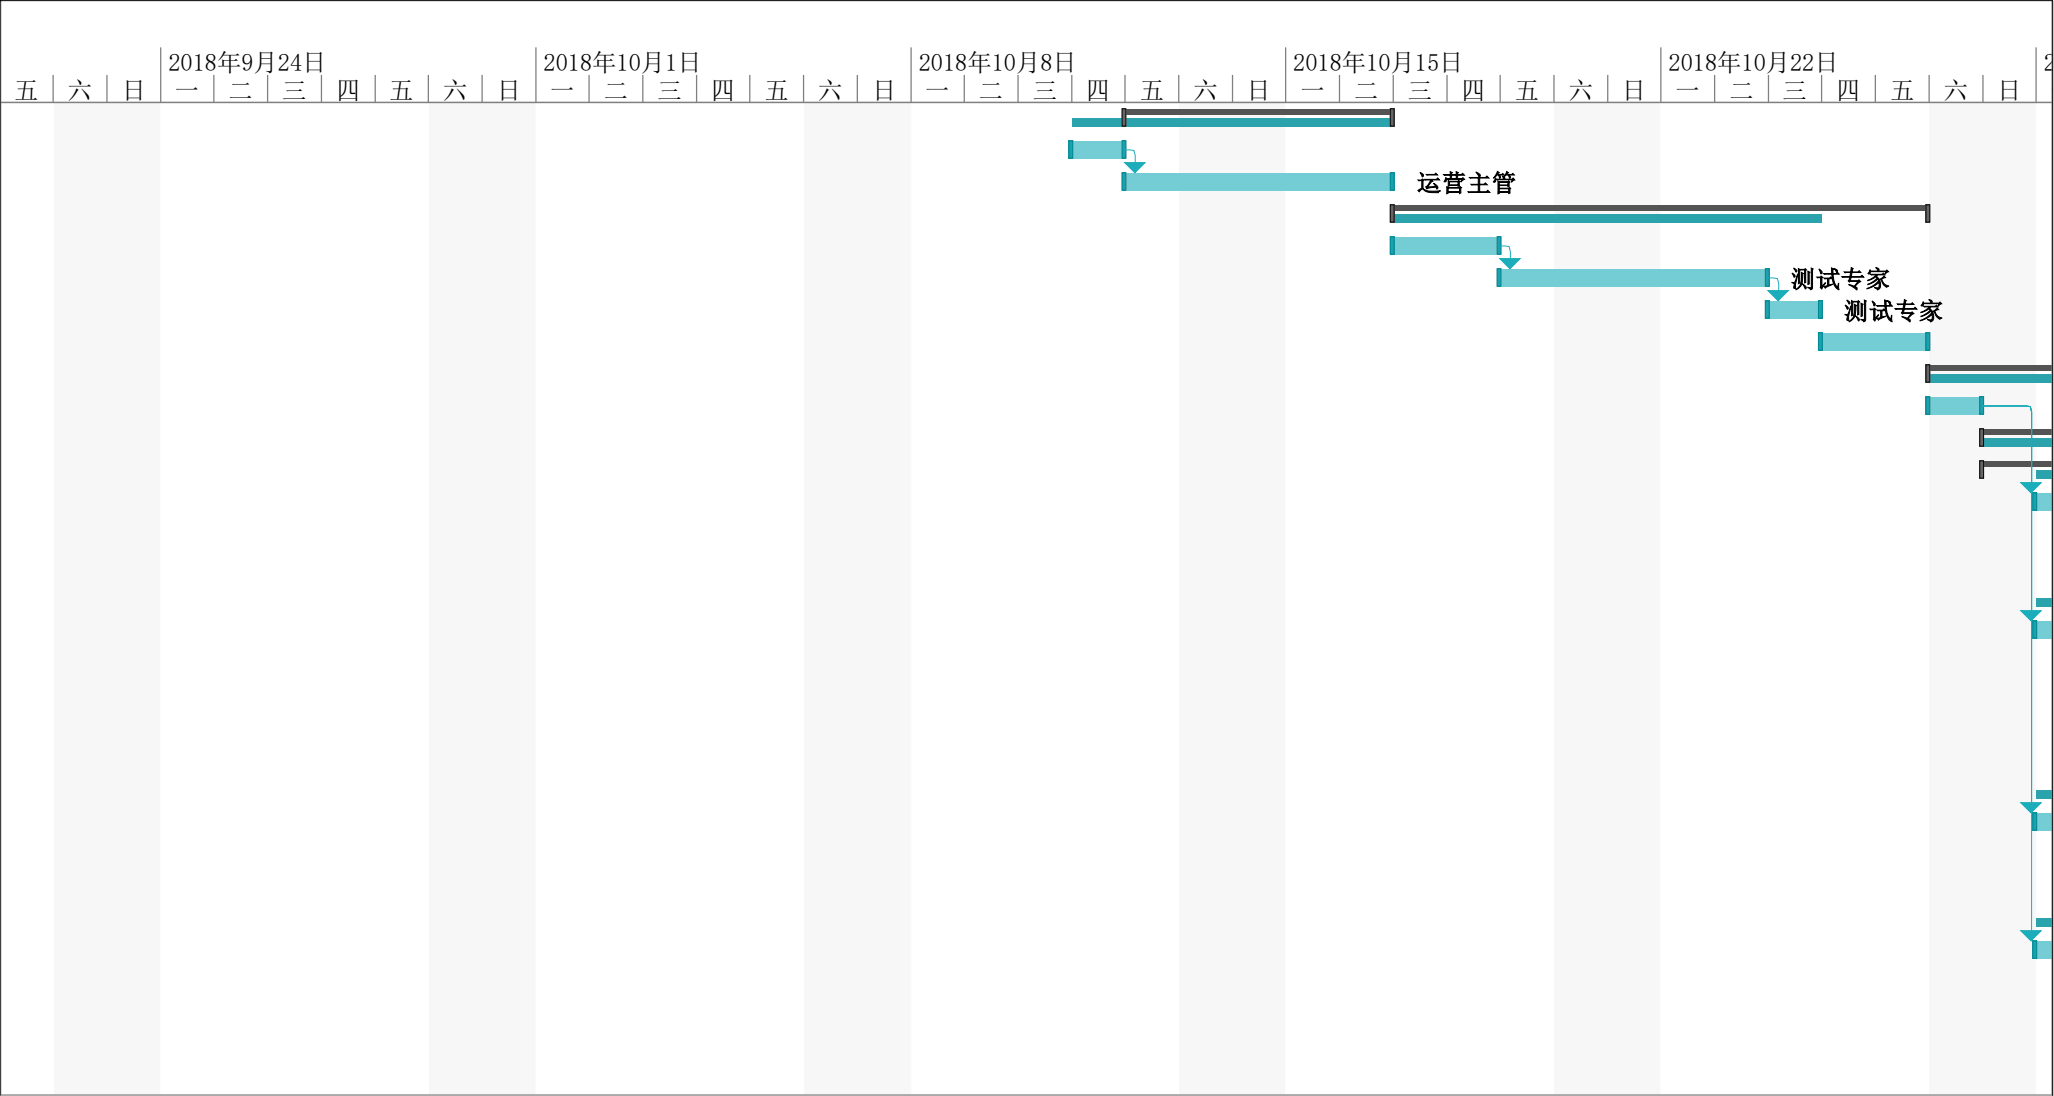

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





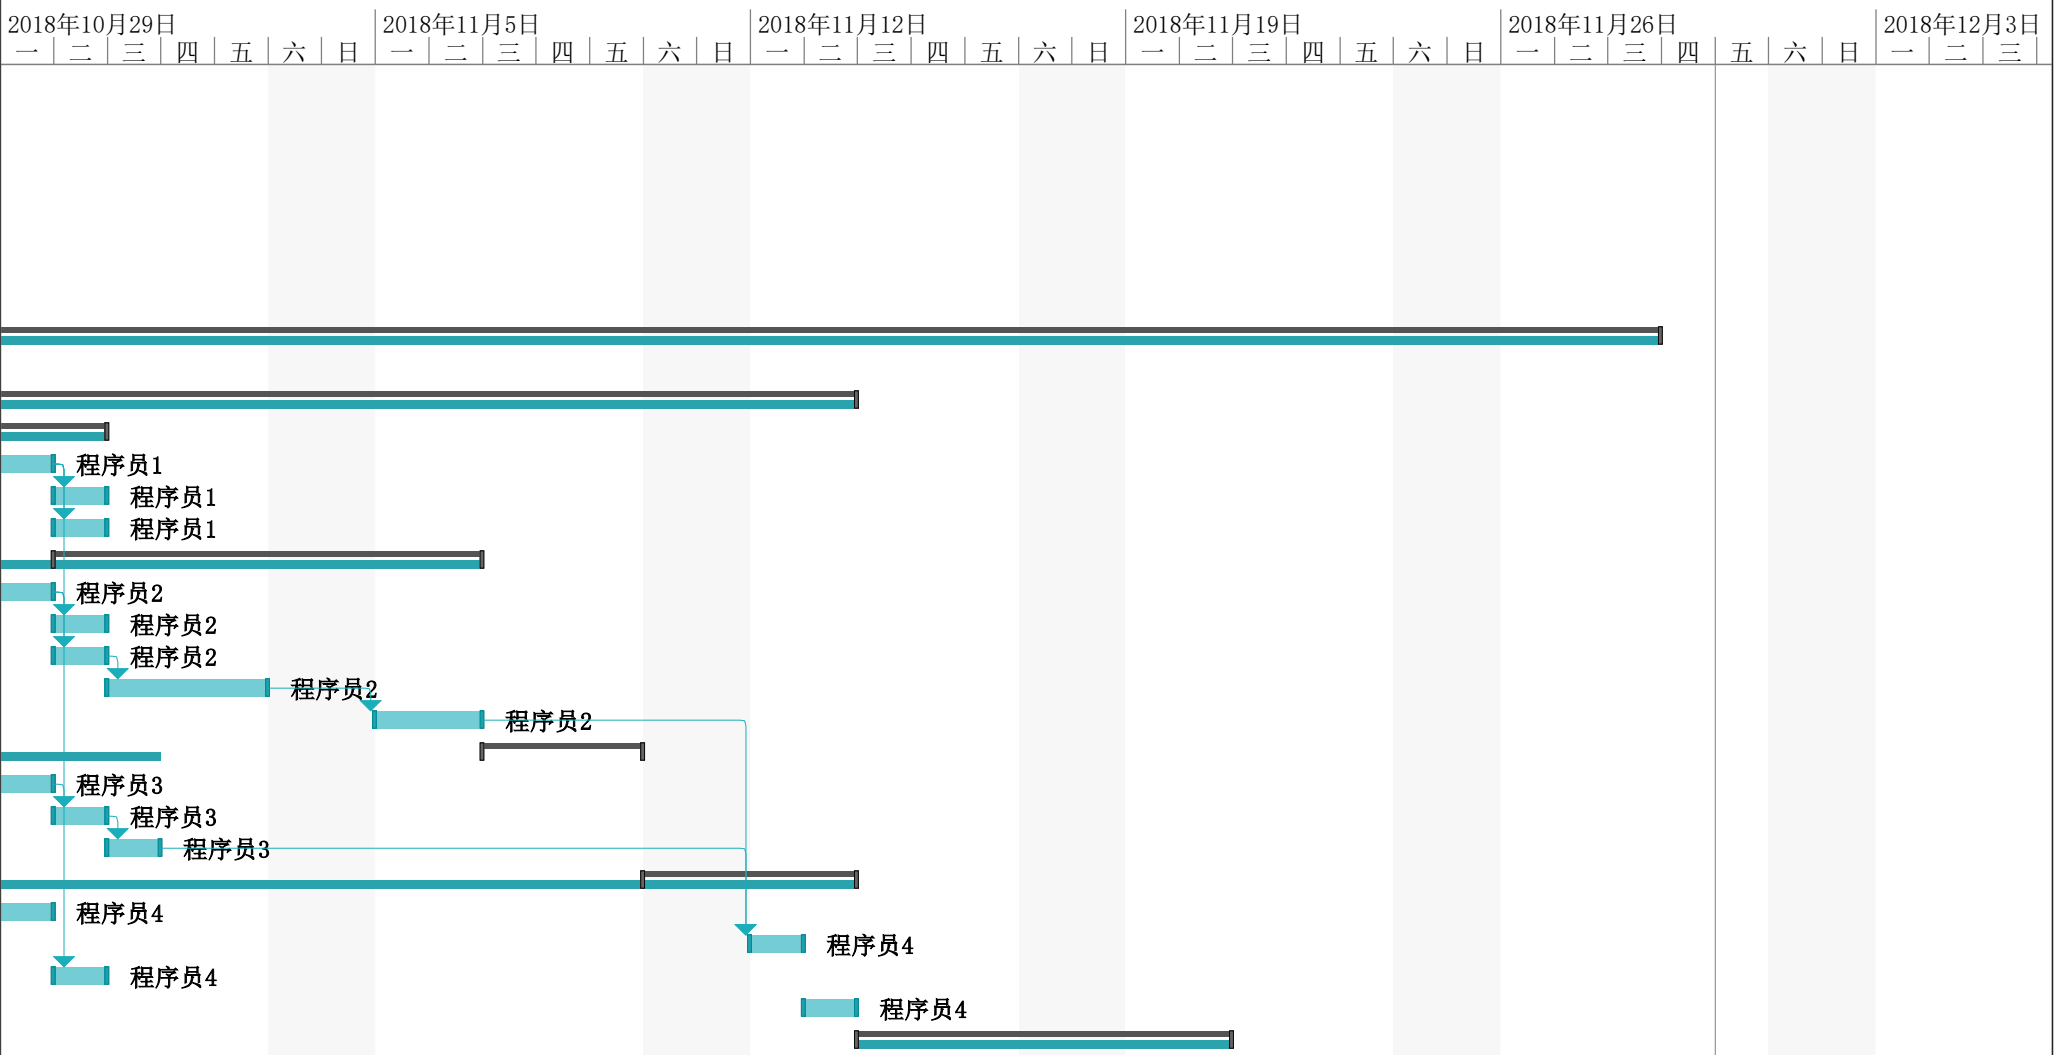

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

